

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

3ER TRIMESTRE 2025

REALIZADO POR:

Alan Montilla
Analista de Proyectos



APROBADO POR:

Yildis Almonte
Directora de Planificación y Desarrollo



TABLA DE CONTENIDO

1. VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	3
2. LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	4
3. DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO	6
3.1. PROYECTO: AUTO CARBONO CERO	6
3.2. PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028.....	7
3.3. PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	8
3.4. PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA.....	9
3.5. PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM	10
3.6. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	11
3.7. PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDOR	12
3.8. PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO.....	14
3.9. PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	15
3.10. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	16
3.11. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES	18
3.12. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	19
3.13. PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA	21
3.14. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA	23
3.15. PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS.....	24
3.16. PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	26
3.17. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”	28


1. VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PERÍODO: 2DO TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2025


RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Total de Proyectos y Planes de Mejora: 37
- Presupuesto Total Aprobado: RD\$4,073,347,611.22
- Monto Ejecutado a la Fecha: RD\$2,190,145,670.17
- Avance Físico Promedio: 53.77%
- Avance Financiero Promedio: 58.09%

ESTATUS DE PROYECTOS




DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

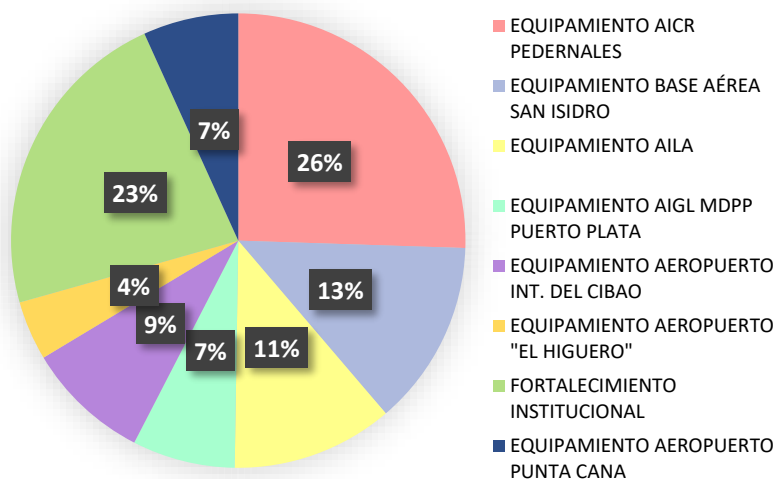


PROGRAMA	PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO AICR PEDERNALES	RD\$1,039,500,000.00
EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO	RD\$538,917,734.46
EQUIPAMIENTO AILA	RD\$468,450,000.00
EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA	RD\$298,166,906.96
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	RD\$359,242,740.00
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"	RD\$171,973,836.31
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	RD\$920,936,913.77
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA	RD\$276,159,479.72


AVANCE FÍSICO GENERAL

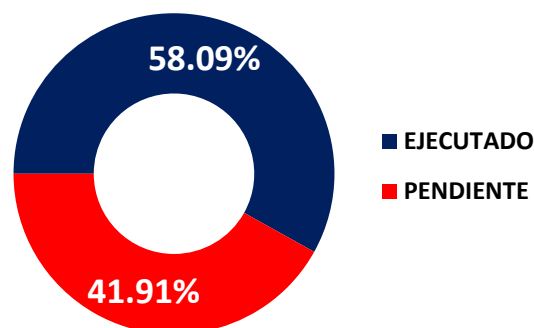

AVANCE FINANCIERO GENERAL

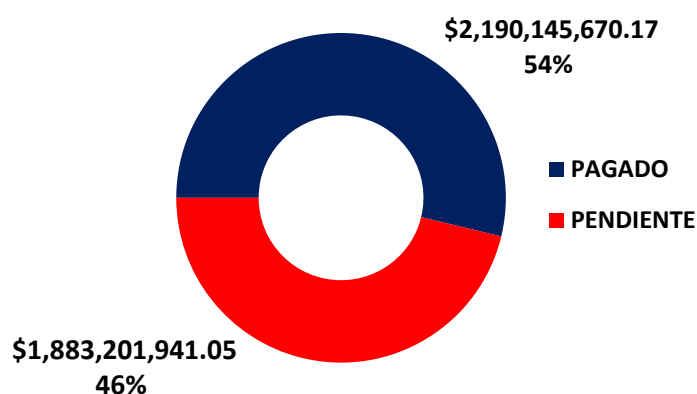

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS



2. LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN DE MEJORA	ESTATUS
PROGRAMA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
PM-DNV-001-2020	RPAS/DRONES SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO	CERRADO
PRY-DFISC-001-2021	CERTIFICACIÓN ISO 37301	CERRADO
PRY-DA-001-2021	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES	CERRADO
PRY-DTIC-001-2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CERRADO
PRY-DTIC-002-2021	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO	CERRADO
PRY-DTAC-001-2021	IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS	CERRADO
PRY-DDS-001-2021	AUTO CARBONO CERO	CERRADO
PRY-DA-002-2022	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS	CERRADO
PRY-DCRP-001-2022	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)	CERRADO
PRY-DTIC-001-2023	BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CERRADO
PRY-DPD-001-2024	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	CERRADO
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	PAUSADO
PRY-DINA-001-2021	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	EJECUCIÓN
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN
PM-DTIC-001-2025	SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DTAC-001-2025	DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	PLANIFICACIÓN
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO DE SAN ISIDRO (MDSI)		
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	EJECUCIÓN
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)		
PRY-DINA-005-2023	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)	CERRADO
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	EJECUCIÓN
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)		
PRY-DINA-003-2022	NUEVO VOR/DME PNA	CERRADO
PRY-DINA-001-2019	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA	CERRADO
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSI)		
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	PAUSADO
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)		
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	PAUSADO
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)		
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”	PAUSADO
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL CABO ROJO - PEDERNALES		
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO

RD\$920,936,913.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



51.79%



TOTAL PROYECTOS

20

AVANCE FÍSICO



68.11%

CODIGO	NOMBRE	ESTATUS
PM-DNV-001-2020	INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO	CERRADO
PRY-DFISC-001-2021	CERTIFICACIÓN ISO 37301	CERRADO
PRY-DA-001-2021	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES	CERRADO
PRY-DTIC-001-2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CERRADO
PRY-DTIC-002-2021	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO	CERRADO
PRY-DTAC-001-2021	IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS	CERRADO
PRY-DDS-001-2021	AUTO CARBONO CERO	CERRADO
PRY-DA-002-2022	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS	CERRADO
PRY-DCRP-001-2022	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)	CERRADO
PRY-DTIC-001-2023	BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CERRADO
PRY-DPD-001-2024	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	CERRADO
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	PAUSADO
PRY-DINA-001-2021	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	EJECUCIÓN
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN
PM-DTIC-001-2025	SOLUCIÓN COMUNICACIONES UNIFICADAS Y COLABORATIVAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DTAC-001-2025	DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	PLANIFICACIÓN
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN

3. DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO

3.1. PROYECTO: AUTO CARBONO CERO

Código del Proyecto

PRY-DDS-001-2021

Líder del Proyecto

Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable

Monto de Apropriación


RD\$17,520,750.00

Contratista


PERAVIA MOTORS, S.A.



Avance del Proyecto

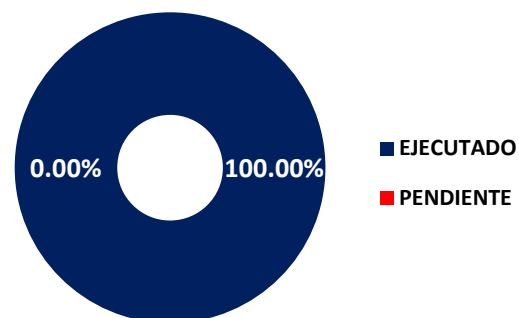

Ejecución Presupuestaria

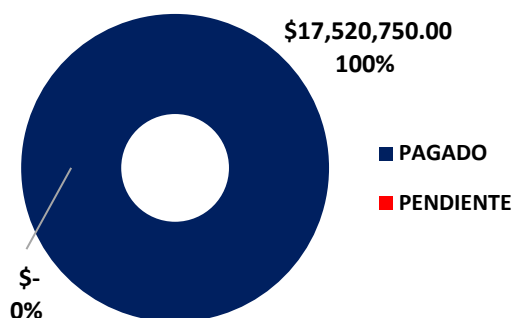

Hitos del Proyecto

- ✓ Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones
- ✓ Pliego de Condiciones
- ✓ Licitación
- ✓ Adquisición de Vehículos
- ✓ Asignación de Vehículos

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

3.2. PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

Código

PRY-DPD-001-2024

Líder del Proyecto

Charmery Graciano, Encargada
Departamento FME PPP

Monto de Apropiación


RD\$1,550,000.00

Contratista


GRH CONSULTORES, S.R.L.



Avance del Proyecto

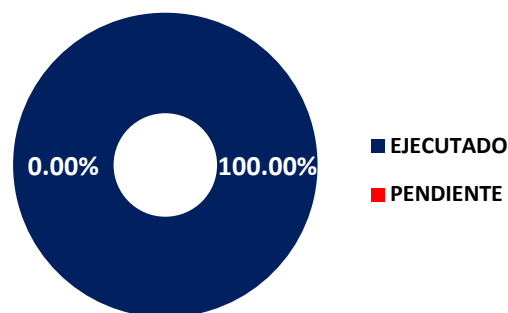

Ejecución Presupuestaria

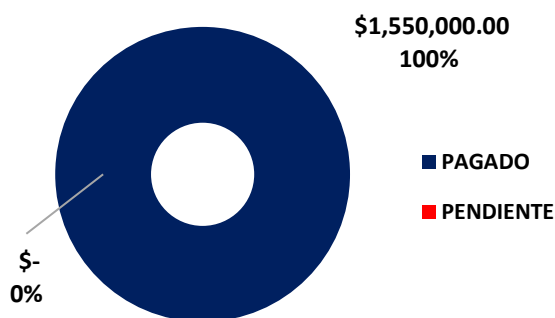

Hitos del Proyecto

- ✓ Preámbulo Objetivos
- ✓ Análisis Estratégico
- ✓ Borrador PEI
- ✓ Revisión
- ✓ Aprobación
- ✓ Presentación y publicación

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

3.3. PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

Código

PRY-DTIC-004-2023

Líder de Proyecto

Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC

Monto de Apropiación


RD\$77,624,232.40

Contratista


INPROTEC, S.R.L.



Avance del Proyecto

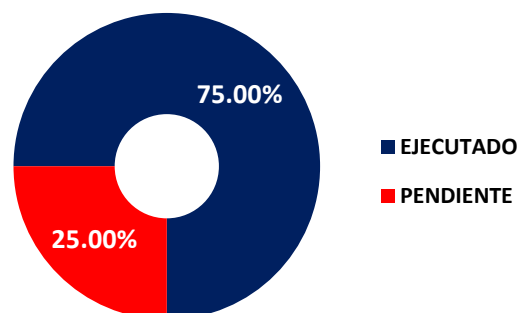

Ejecución Presupuestaria

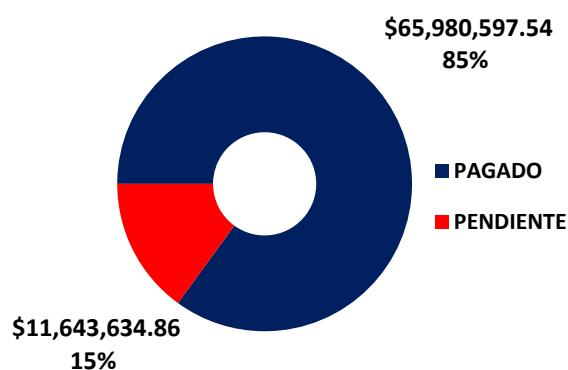

Hitos del Proyecto

- ✓ Levantar Proceso de Compra
- ✓ Asignación de Proveedor
- ✓ Implementación del Sistema de Seguridad Física NG
- Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema

Próximas Acciones

- Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas

Estatus

EJECUCIÓN

3.4. PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

Código

PRY-DA-001-2022

Líder de Proyecto

Felipe Diloné

Monto de Apropriación


RD\$114,030,000.00

Contratista


ROMACA INDUSTRIAL, S.A.



Avance del Proyecto

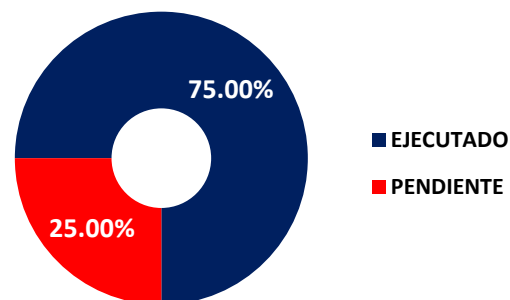

Ejecución Presupuestaria

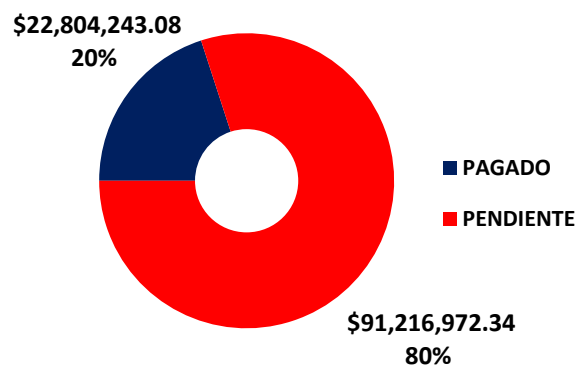

Hitos del Proyecto

- ✓ Adecuación del lugar
- ✓ Adquisición del sistema
- Entrenamiento del personal
- ✓ Puesta en funcionamiento

Próximas Acciones

- Programación y visualización del sistema.
- Configuración de todas las manejadoras.
- Realizar entrenamientos.

Estatus

EJECUCIÓN

3.5. PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM

Código

PRY-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo

Monto de Apropiación

RD\$358,200,000.00

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto



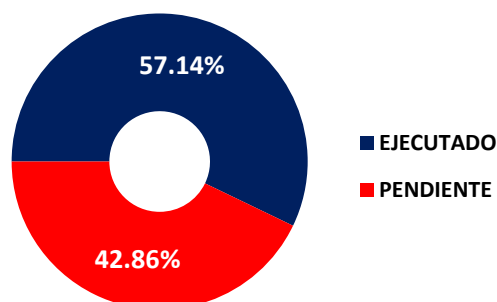


Diagrama de red Rack Norge Botello (19/12/24)

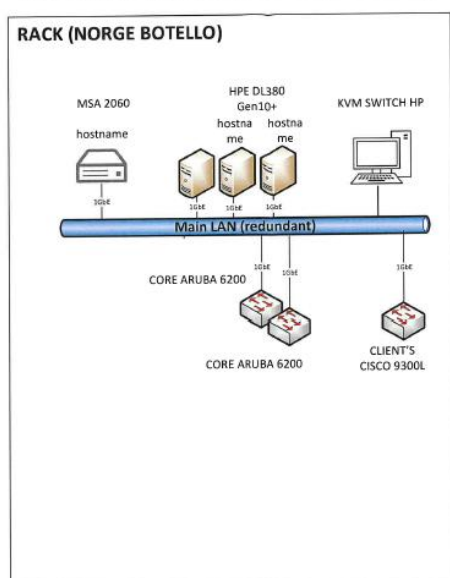

Ejecución Presupuestaria

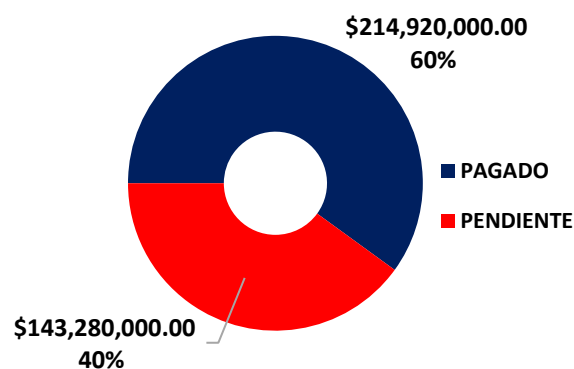

Hitos del Proyecto

- ✓ Diseño del Sistema
- ✓ Personalización del Sistema
- ✓ FAT
- Instalación y Puesta en Marcha
- SAT
- ✓ Entrenamientos en Fábrica
- Entrenamientos En Sitio
- Garantía

Próximas Acciones

- Puesta en marcha del sistema

Estatus

EJECUCIÓN

3.6. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Código

PM-DINA-002-2022

Líder de Proyecto


Elvis Collado, Encargado División
Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación


RD\$57,423,551.20

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.

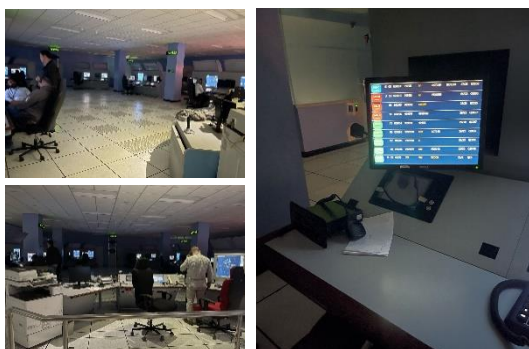

Avance del Proyecto

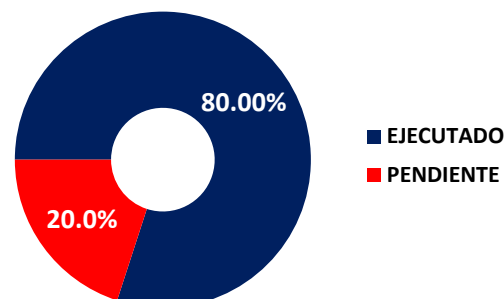

Ejecución Presupuestaria

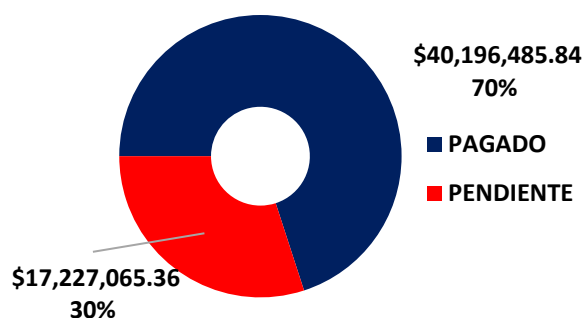

Hitos del Proyecto

- ✓ Licitación
- ✓ FAT
- ✓ Instalación Sistema de Comunicaciones
- SAT

Próximas Acciones

- Realizar SAT
- Recepción de Bienes y Servicios Conforme

Estatus

EJECUCIÓN

3.7. PLAN DE MEJORA: ATM- AMBIENTE DE SERVIDOR

Código

PM-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Jonathan Méndez, Encargado División
Sistemas Radar


Monto de Apropriación

RD\$45,600,000.00


Contratista

No Definido

Avance del Plan de Mejora

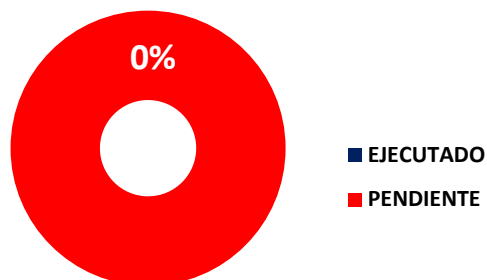

Ejecución Presupuestaria

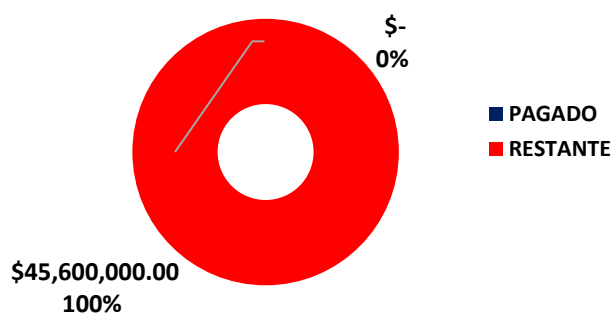

Hitos del Plan de Mejora

- Licitación
- Instalación y Puesta en Marcha
- Entrenamiento

Próximas Acciones

- Licitación y adjudicación

Estatus

PLANIFICACIÓN, en proceso de compras y contrataciones.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA DE SAN ISIDRO (MDSI)



PRESUPUESTO

RD\$538,917,734.46

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



TOTAL PROYECTOS

3

AVANCE FÍSICO



CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	EJECUCIÓN

3.8. PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

Código del Proyecto

PRY-DVSO-001-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto se Apropiación


RD\$119,417,734.46

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.



Avance del Proyecto

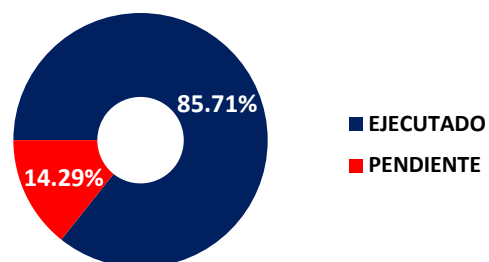

Ejecución Presupuestaria

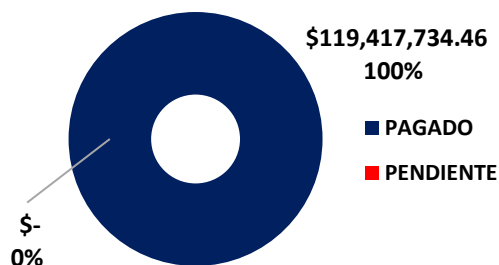

Hitos del Proyecto

- ✓ Recepción y Transporte de Equipos
- ✓ Obra Civil
- ✓ Entrenamientos en Fábrica
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Flight Check
- Aceptación Técnica Operativa

Próximas Acciones

- Publicación internacional de los resultados en el AIP por dos ciclos AIRAC.
- Alimentación eléctrica del VOR desde "Power Room" de la Torre de Control.

Estatus

EJECUCIÓN

3.9. PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

Código

PRY-DVSO-003-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$289,000,000.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

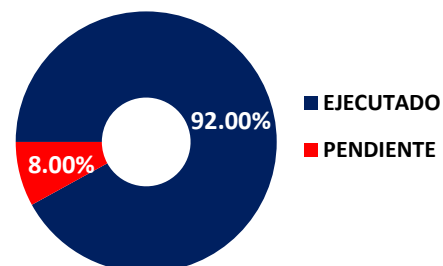

Ejecución Presupuestaria

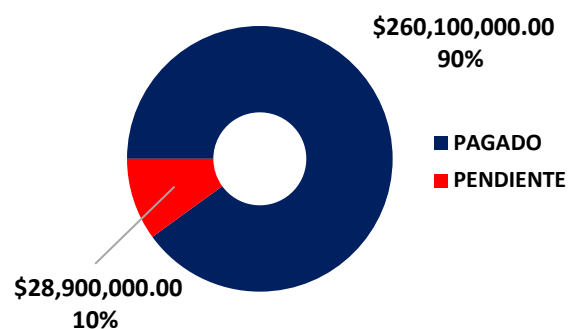

Hitos del Proyecto

- ✓ Obra Civil
- ✓ Cabina de Control
- Equipamiento
- Entrenamiento en Fábrica
- ✓ FAT
- Pruebas de Integración Sistemas
- SAT
- Informe Final de Instalación

Próximas Acciones

- Equipamiento de la Torre
- Realizar SAT

Estatus

EJECUCIÓN

3.10. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

Código

PRY-DVSO-004-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS


Monto de Apropiación

RD\$130,500,000.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

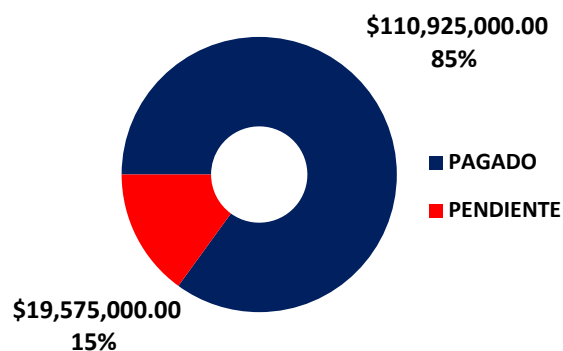

Ejecución Presupuestaria

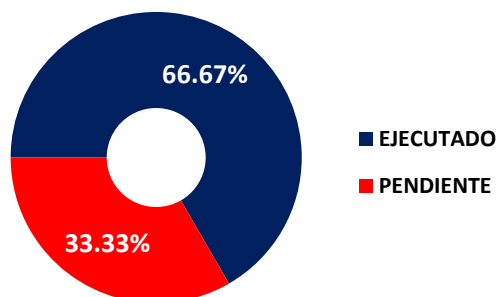

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- ✓ Importación de Equipos
- Transporte de Equipos
- Instalación de Equipos
- SAT

Próximas Acciones

- Concluir cabina de control y alimentación eléctrica.
- Concluir instalación y SAT.

Estatus

EJECUCIÓN

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)



PRESUPUESTO

RD\$298,166,906.96

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

91.83%



TOTAL PROYECTOS

2

AVANCE FÍSICO

92.86%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-005-2023	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)	CERRADO
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	EJECUCIÓN

3.11. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

Código del Proyecto

PRY-DINA-005-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$247,475,600.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto



Ejecución de Presupuesto

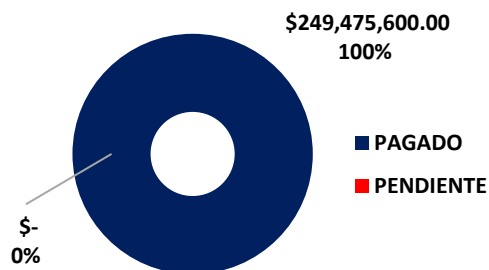

Hitos del Proyecto

- ✓ Adjudicación
- ✓ FAT
- ✓ Construcción del Emplazamiento
- ✓ SAT
- ✓ Inauguración del Sistema

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

3.12. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

Código

PM-DINA-003-2022

Líder de Proyecto

Elvis Antonio Collado

Monto de Apropiación


RD\$48,691,306.96

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.



Avance del Proyecto

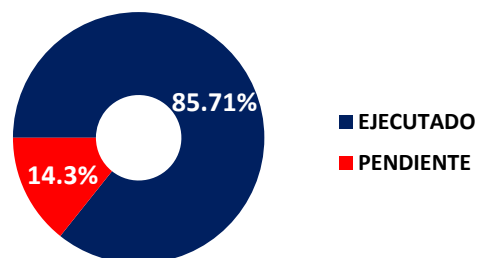

Ejecución Presupuestaria

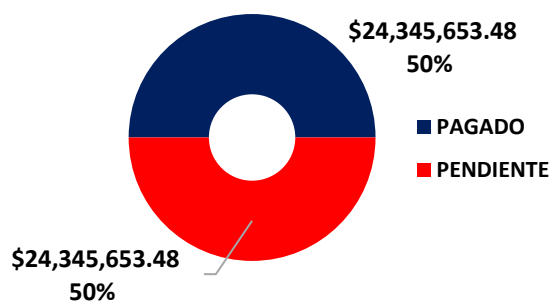

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamientos
- ✓ Importación de Equipos
- ✓ Transporte de Equipos
- ✓ Adecuación de Torre de Control
- ✓ Instalación de Sistema de Comunicación
- SAT

Próximas Acciones

- Realizar pruebas de aceptación en sitio (SAT).

Estatus

EJECUCIÓN

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)



PRESUPUESTO

RD\$276,159,479.72

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

100%



TOTAL PROYECTOS

2

AVANCE FÍSICO

100%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2019	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA	CERRADO
PRY-DINA-003-2022	NUEVO VOR/DME PNA	CERRADO

3.13. PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

Código del Proyecto

PRY-DINA-003-2022

Líder del Proyecto

Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado
División de Radio Ayudas

Monto se Apropriación


RD\$119,500,000.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

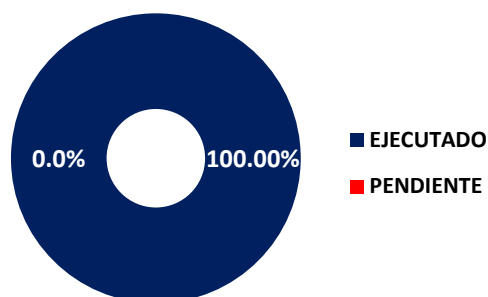

Ejecución Presupuestaria

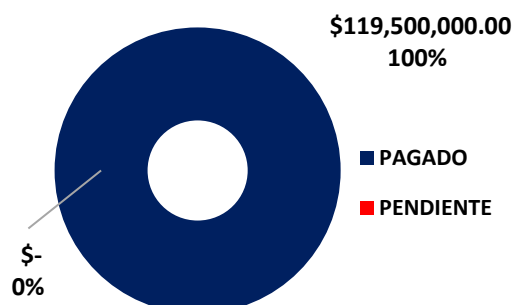

Hitos del Proyecto

- ✓ Licitación
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Flight check
- ✓ Promulgación de la Publicación de la Facilidad

Próximas Acciones

- Inauguración del nuevo DVOR/DME en Punta Cana

Estatus

CERRADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)



PRESUPUESTO

RD\$468,450,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



47.26%



TOTAL PROYECTOS

3

AVANCE FÍSICO



26.19%

CODIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	PAUSADO
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN

3.14. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA

Código

PRY-DINA-001-2022

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$249,000,000.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

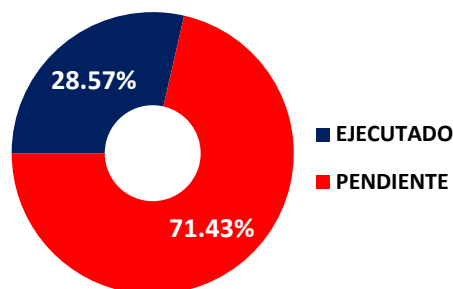

Ejecución Presupuestaria

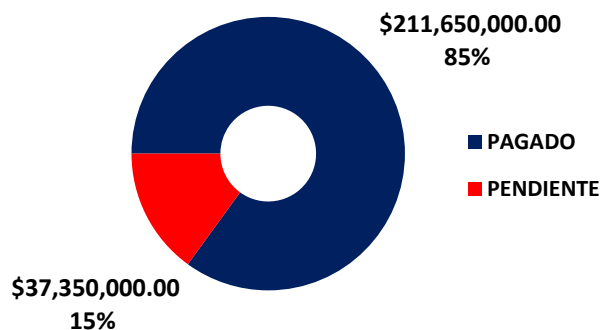

Hitos del Proyecto

- ✓ Entrenamientos
- ✓ FAT
- SAT
- Capacitación en Campo
- Sistemas de Vigilancia y Seguridad
- Climatización
- Energía Eléctrica

Próximas Acciones

- Conclusión de Obra Civil

Estatus

EJECUCIÓN

3.15. PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

Código

PRY-DVSO-002-2023

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División
Comunicaciones de Radio


Monto de Apropiación

RD\$19,450,000.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

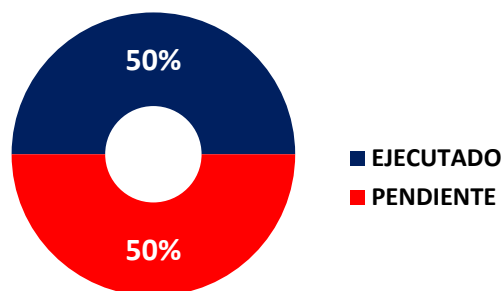

Ejecución Presupuestaria

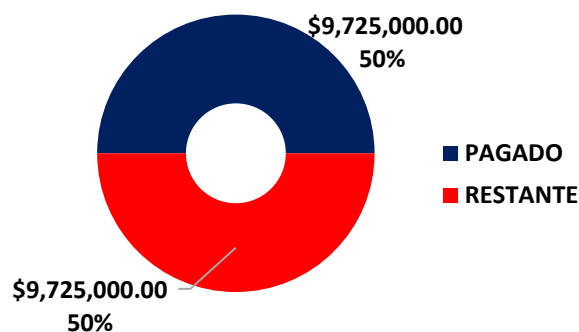

Hitos del Proyecto

- ✓ Aprobación Proyecto
- ✓ Firma Contrato
- ✓ FAT
- Instalación y Puesta en Marcha
- SAT
- Entrenamiento
- Cierre

Próximas Acciones

- Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL

Estatus

PAUSADO, pendiente radio enlace solicitado a INDOTEL.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)



PRESUPUESTO

RD\$359,242,740.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



TOTAL PROYECTOS

1

AVANCE FÍSICO



CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	PAUSADO

3.16. PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

Código

PRY-DINA-002-2021

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS


Monto de Apropriación

RD\$359,242,740.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

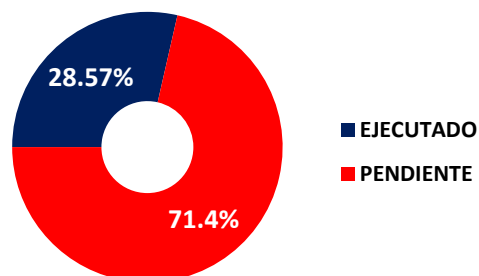

Ejecución Presupuestaria

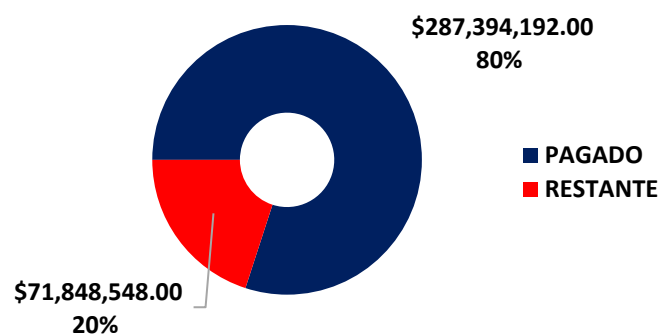

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- Recepción de Equipos
- Instalación
- SAT
- Flight Check
- Recepción Conforme de Bienes

Próximas Acciones

- Instalación, configuración y capacitación del personal.

Estatus

PAUSADO, pendiente determinar la ejecución de la obra civil.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)



PRESUPUESTO

RD\$171,973,836.31

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



TOTAL PROYECTOS

1

AVANCE FÍSICO



CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL "EL HIGÜERO"	PAUSADO

3.17. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”

Código

PRY-DINA-001-2020

Líder de Proyecto


Elvis Collado, Encargado División
Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación


RD\$171,973,836.31

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.

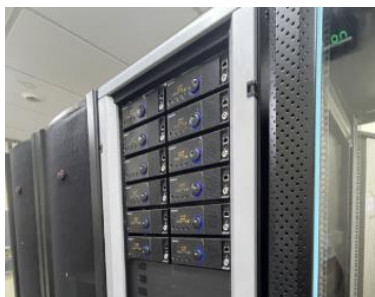

Avance del Proyecto

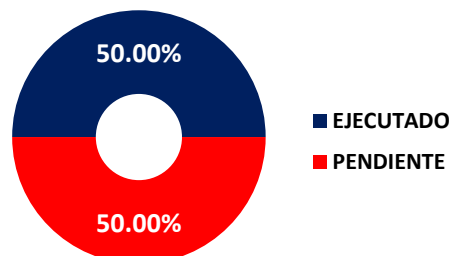

Ejecución Presupuestaria

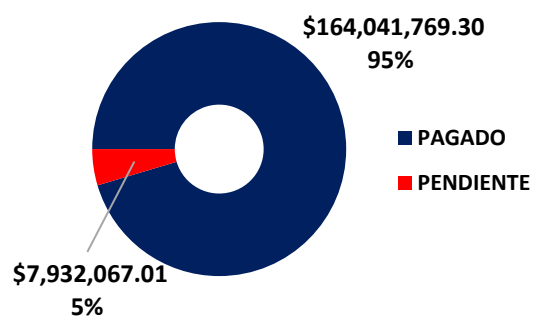

Hitos del Plan de Mejora

- ✓ Contratación
- ✓ FAT
- SAT
- Implementación y Puesta en Marcha

Próximas Acciones

- Concluir instalación

Estatus

PAUSADO, pendiente pago al contratista.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO



PRESUPUESTO

RD\$1,039,500,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



0.00%

Proyectos en etapa de Planificación



TOTAL PROYECTOS

5

AVANCE FÍSICO



0.00%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA "AWOS" AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN
