

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

JUNIO 2026

REALIZADO POR:

D/D GUSTAVO DOMÍNGUEZ

Carlos Dominguez
Coordinador de Proyectos



APROBADO POR:

Yildis Almonte

Yildis Almonte
Directora de Planificación y Desarrollo



TABLA DE CONTENIDO

1. VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	3
1. LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA	4
2. DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO	7
2.1. PROYECTO: AUTO CARBONO CERO	7
2.2. PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028.....	8
2.3. PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	9
2.4. PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA.....	10
2.5. PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM	11
2.6. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	12
2.7. PLAN DE MEJORA: ATM - AMBIENTE DE SERVIDOR.....	13
2.8. PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	15
2.9. PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	16
2.10. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	17
2.11. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES	19
2.12. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	20
2.13. PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA	21
2.14. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA	24
2.15. PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS.....	25
2.16. PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	27
2.17. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”	30

1. VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA



PERÍODO: TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2026

RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- **Total de Proyectos y Planes de Mejora:** 41
- **Presupuesto Total Aprobado:** RD\$5,048,752,661.88
- **Monto Ejecutado a la Fecha:** RD\$2,382,182,836.63
- **Avance Físico Promedio:****58.98%**
- **Avance Financiero Promedio:****47.18%**


AVANCE FÍSICO GENERAL

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

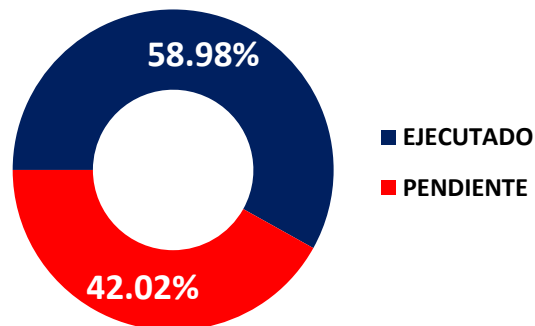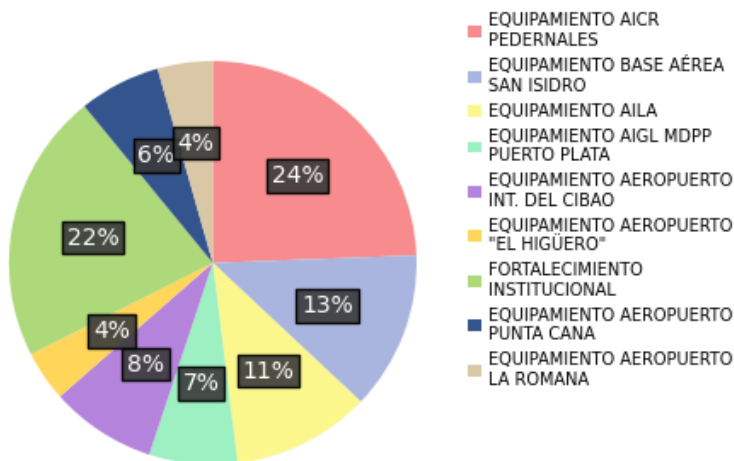

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA	PRESUPUESTO
EQUUPAMIENTO AICR PEDERNALES	RD\$1,034,500,000.00
EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO	RD\$613,883,077.35
EQUIPAMIENTO AILA	RD\$468,450,000.00
EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA	RD\$678,166,906.96
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	RD\$359,242,740.00
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"	RD\$171,973,836.31
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	RD\$1,194,125,603.33
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA	RD\$276,159,479.72
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO LA ROMANA	RD\$186,100,000.00



1. LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO / PLAN DE MEJORA	ESTATUS
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	CERRADO
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	CERRADO
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	CERRADO
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	CERRADO
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	CERRADO
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	CERRADO
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	EN CIERRE
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	EJECUCIÓN
PRY-DINA-001-2021	AIM-SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	EJECUCIÓN
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	EJECUCIÓN
PRY-DTAC-001-2025	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSNA-001-2026	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSNA-002-2026	SISTEMA DVOR/DME MDLR (LA ROMANA)	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2026	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERONAVES NO TRIPULADAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2026	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA	PLANIFICACIÓN
PRY-DDS-001-2026	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN DEL RUIDO AERONÁUTICO	PLANIFICACIÓN
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA "AWOS" AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL "EL HIGÜERO"	PAUSADO
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	PAUSADO
PRY-DINA-001-2019	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA	CERRADO
PRY-DTIC-002-2021	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO	CERRADO
PRY-DTAC-001-2021	"IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS"	CERRADO
PRY-DA-001-2021	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES	CERRADO
PM-DNV-001-2020	INTEGRACIÓN DE LOS RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO	CERRADO
PRY-DCRP-001-2022	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)	CERRADO
PRY-DA-002-2022	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS	CERRADO
PRY-DFISC-001-2021	CERTIFICACIÓN ISO 37301	CERRADO
PRY-DTIC-001-2023	BASE DE DATOS INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CERRADO
PRY-DTIC-001-2021	PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL	CERRADO

PRY-DDS-001-2021	AUTO CARBONO CERO	CERRADO
PRY-DPD-001-2024	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	CERRADO
PRY-DINA-003-2022	NUEVO VOR-DME PNA	CERRADO
PRY-DINA-005-2023	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)	CERRADO

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO

RD\$1,194,125,603.3



TOTAL PROYECTOS

22

CODIGO	NOMBRE	ESTATUS
PM-DNV-001-2020	INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO	CERRADO
PRY-DFISC-001-2021	CERTIFICACIÓN ISO 37301	CERRADO
PRY-DA-001-2021	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES	CERRADO
PRY-DTIC-001-2021	PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL	CERRADO
PRY-DTIC-002-2021	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO	CERRADO
PRY-DTAC-001-2021	IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS	CERRADO
PRY-DDS-001-2021	AUTO CARBONO CERO	CERRADO
PRY-DA-002-2022	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS	CERRADO
PRY-DCRP-001-2022	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)	CERRADO
PRY-DTIC-001-2023	BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CERRADO
PRY-DPD-001-2024	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	CERRADO
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	CERRADO
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	CERRADO
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	EJECUCIÓN
PRY-DINA-001-2021	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN
PRY-DTAC-001-2025	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	PLANIFICACIÓN
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2026	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERNOAVES NO TRIPULADAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-002-2026	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA	PLANIFICACIÓN
PRY-DDS-001-2026	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN RUIDO AERONÁUTICO	PLANIFICACIÓN

2. DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO

2.1. PROYECTO: AUTO CARBONO CERO

Código del Proyecto

PRY-DDS-001-2021

Líder del Proyecto

Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable

Monto de Apropiación


RD\$17,520,750.00

Contratista


PERAVIA MOTORS, S.A.



Avance del Proyecto

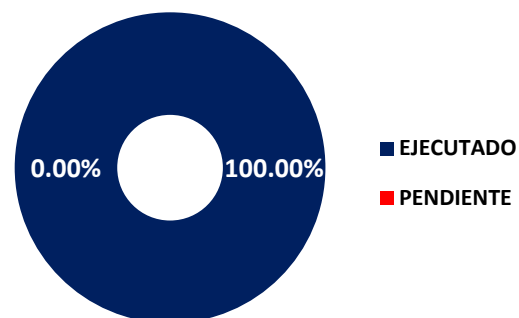

Ejecución Presupuestaria

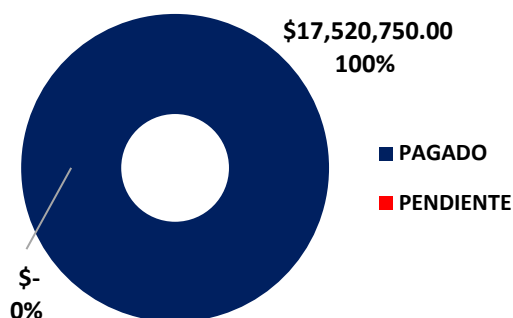

Hitos del Proyecto

- ✓ Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones
- ✓ Pliego de Condiciones
- ✓ Licitación
- ✓ Adquisición de Vehículos
- ✓ Asignación de Vehículos

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

2.2. PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

Código

PRY-DPD-001-2024

Líder del Proyecto

Charmery Graciano, Encargada
Departamento FME PPP

Monto de Apropiación


RD\$1,550,000.00

Contratista


GRH CONSULTORES, S.R.L.



Avance del Proyecto

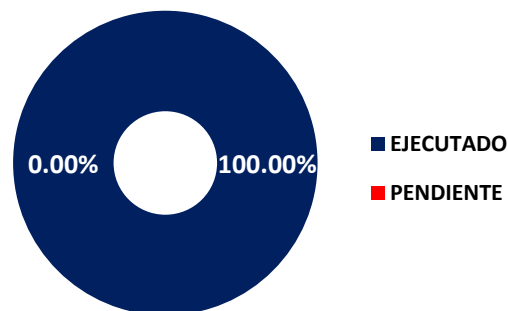

Ejecución Presupuestaria

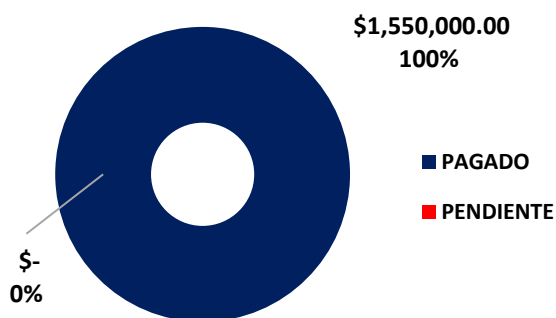

Hitos del Proyecto

- ✓ Preámbulo Objetivos
- ✓ Análisis Estratégico
- ✓ Borrador PEI
- ✓ Revisión
- ✓ Aprobación
- ✓ Presentación y publicación

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

2.3. PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

Código

PRY-DTIC-004-2023

Líder de Proyecto

Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC

Monto de Apropiación


RD\$77,624,232.40

Contratista


INPROTEC, S.R.L.



Avance del Proyecto

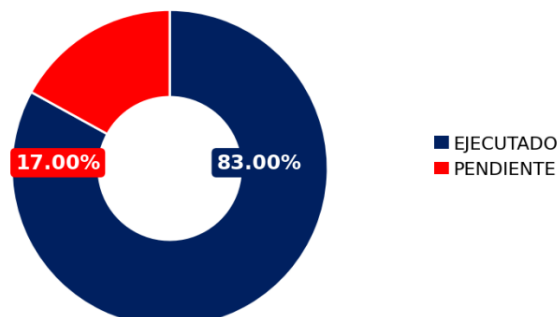

Ejecución Presupuestaria

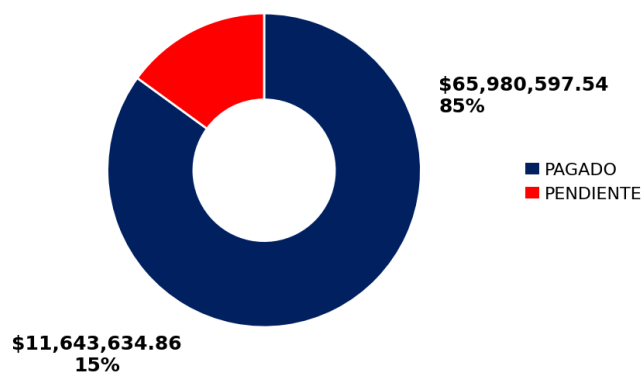

Hitos del Proyecto

- ✓ Levantar Proceso de Compra
- ✓ Asignación de Proveedor
- ✓ Implementación del Sistema de Seguridad Física NG
- Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema

Próximas Acciones

- Realizar la prueba comunicación de las antenas instaladas

Estatus

EJECUCIÓN

2.4. PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

Código

PRY-DA-001-2022

Líder de Proyecto

Felipe Diloné

Monto de Apropiación


RD\$119,011,766.62

Contratista


ROMACA INDUSTRIAL, S.A.



Avance del Proyecto

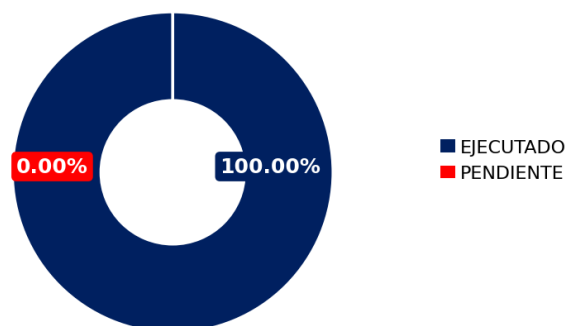

Ejecución Presupuestaria

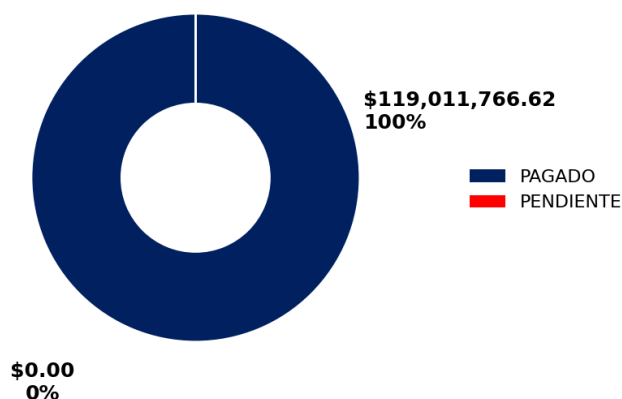

Hitos del Proyecto

- ✓ Adecuación del lugar
- ✓ Adquisición del sistema
- ✓ Entrenamiento del personal
- ✓ Puesta en funcionamiento

Estatus

CERRADO

2.5. PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM

Código

PRY-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo


Monto de Apropriación

RD\$358,200,000.00

Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.

Avance del Proyecto

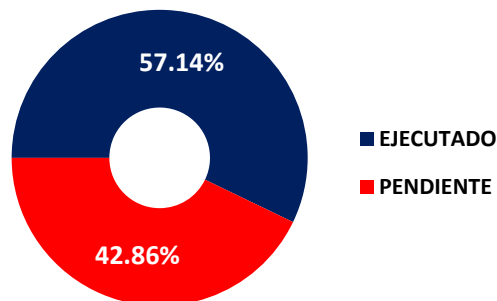

Ejecución Presupuestaria


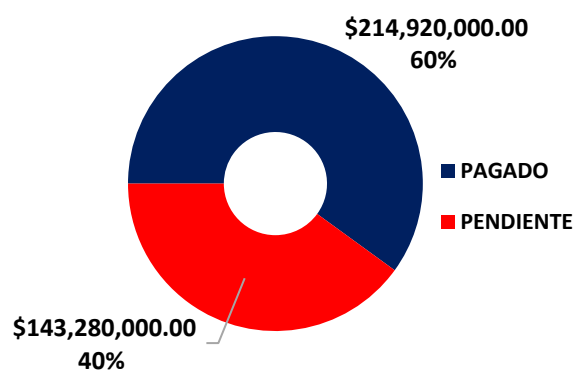


Diagrama de red Rack Norge Botello (19/12/24)

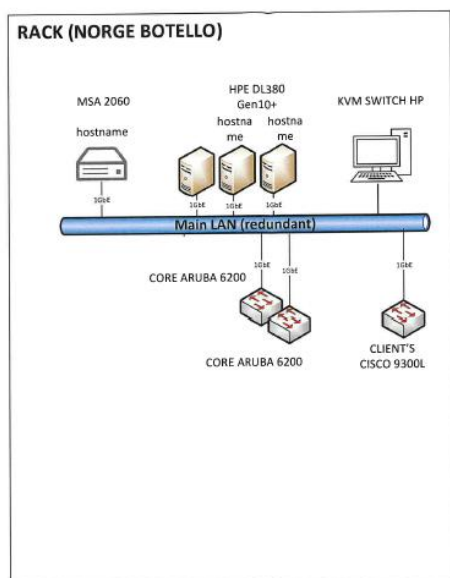

Hitos del Proyecto

- ✓ Diseño del Sistema
- ✓ Personalización del Sistema
- ✓ FAT
- Instalación y Puesta en Marcha
- SAT
- ✓ Entrenamientos en Fábrica
- Entrenamientos En Sitio
- Garantía

Próximas Acciones

- Puesta en marcha del sistema

Estatus

EJECUCIÓN

2.6. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Código

PM-DINA-002-2022

Líder de Proyecto


Elvis Collado, Encargado División
Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación


RD\$57,423,551.20

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.

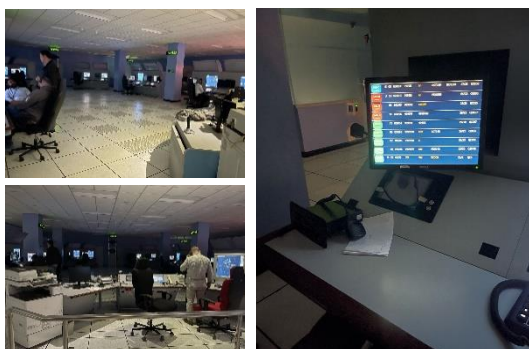

Avance del Proyecto

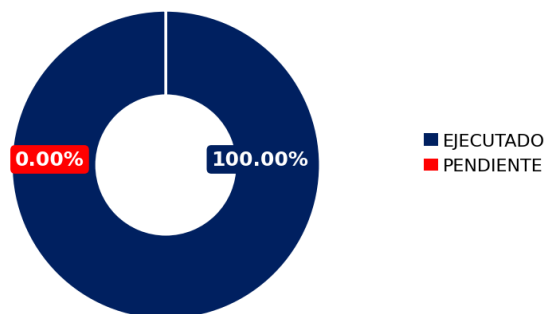

Ejecución Presupuestaria

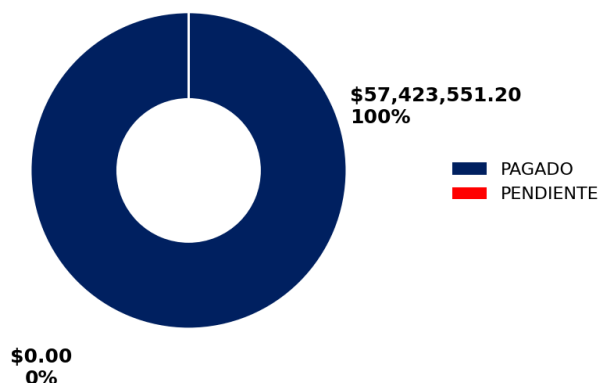

Hitos del Proyecto

- ✓ Licitación
- ✓ FAT
- ✓ Instalación Sistema de Comunicaciones
- ✓ SAT

Estatus

CERRADO

2.7. PLAN DE MEJORA: ATM- AMBIENTE DE SERVIDOR

Código

PM-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Jonathan Méndez, Encargado División
Sistemas Radar


Monto de Apropriación

RD\$45,600,000.00


Contratista

XBYTE, SRL.

Avance del Plan de Mejora

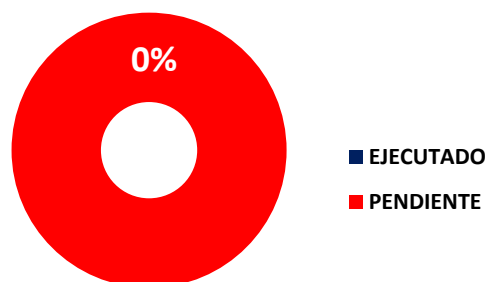

Ejecución Presupuestaria

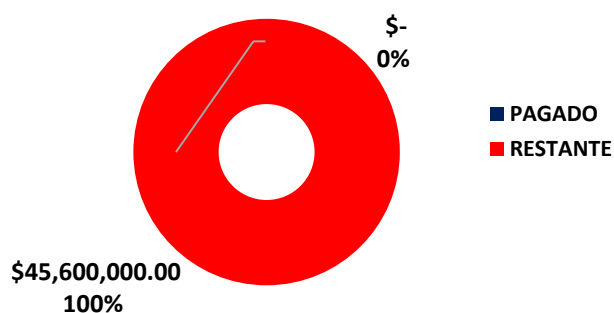

Hitos del Plan de Mejora

- ✓ Licitación
- Instalación y Puesta en Marcha
- Entrenamiento

Próximas Acciones

- Licitación y adjudicación

Estatus

EJECUCIÓN

PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA DE SAN ISIDRO (MDSI)



PRESUPUESTO

RD\$613,883,077.35

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

100%



TOTAL PROYECTOS

3

AVANCE FÍSICO

100%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	CERRADO
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	CERRADO
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	CERRADO

2.8. PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

Código del Proyecto

PRY-DVSO-001-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto se Apropriación


RD\$119,417,734.46

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.



Avance del Proyecto

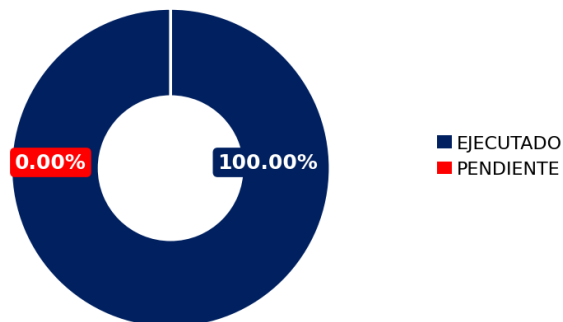

Ejecución Presupuestaria

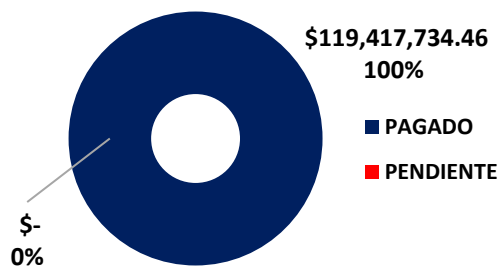

Hitos del Proyecto

- ✓ Recepción y Transporte de Equipos
- ✓ Obra Civil
- ✓ Entrenamientos en Fábrica
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Flight Check
- ✓ Aceptación Técnica Operativa

Estatus

CERRADO

2.9. PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

Código

PRY-DVSO-003-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$334,559,713.39

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

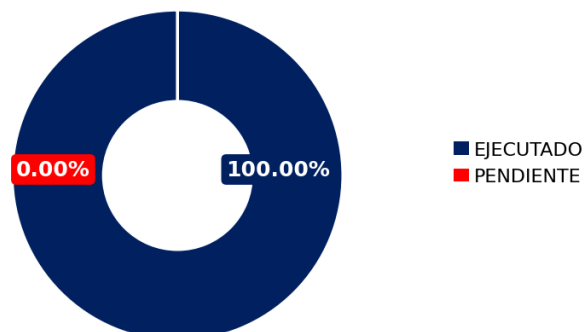

Ejecución Presupuestaria

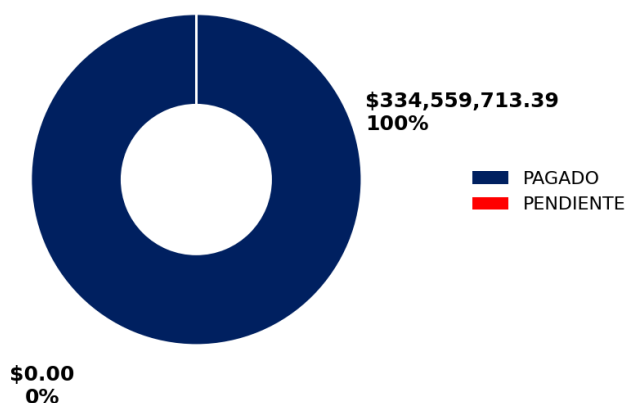

Hitos del Proyecto

- ✓ Obra Civil
- ✓ Cabina de Control
- ✓ Equipamiento
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- ✓ FAT
- ✓ Pruebas de Integración Sistemas
- ✓ SAT
- ✓ Informe Final de Instalación

Estatus

CERRADO

2.10. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

Código

PRY-DVSO-004-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$130,500,000.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

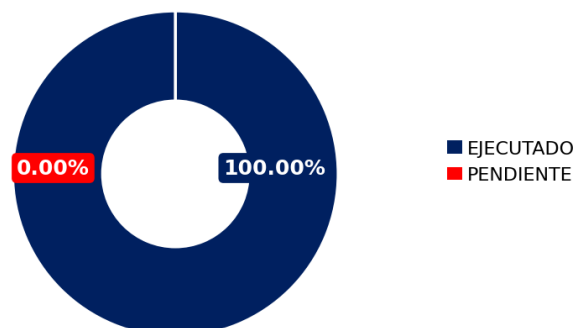

Ejecución Presupuestaria

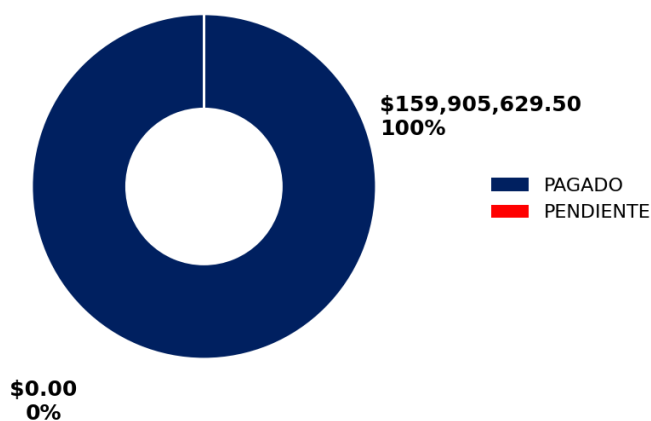

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- ✓ Importación de Equipos
- ✓ Transporte de Equipos
- ✓ Instalación de Equipos
- ✓ SAT

Estatus

CERRADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)



PRESUPUESTO

RD\$678,166,906.96

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-005-2023	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)	CERRADO
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	CERRADO
PRY-DVSNA-001-2026	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)	PLANIFICACIÓN

2.11. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

Código del Proyecto

PRY-DINA-005-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$249,475,600.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto



Ejecución de Presupuesto

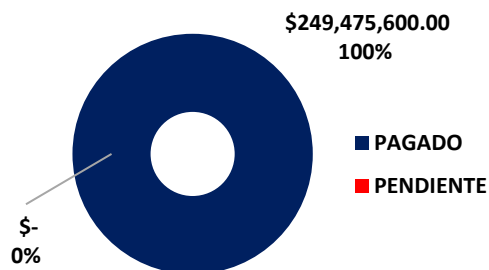

Hitos del Proyecto

- ✓ Adjudicación
- ✓ FAT
- ✓ Construcción del Emplazamiento
- ✓ SAT
- ✓ Inauguración del Sistema

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

2.12. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

Código

PM-DINA-003-2022

Líder de Proyecto


Elvis Antonio Collado

Monto de Apropiación


RD\$48,691,306.96

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.

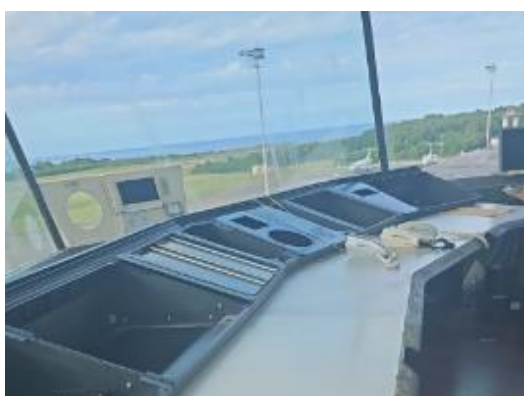

Ejecución Presupuestaria

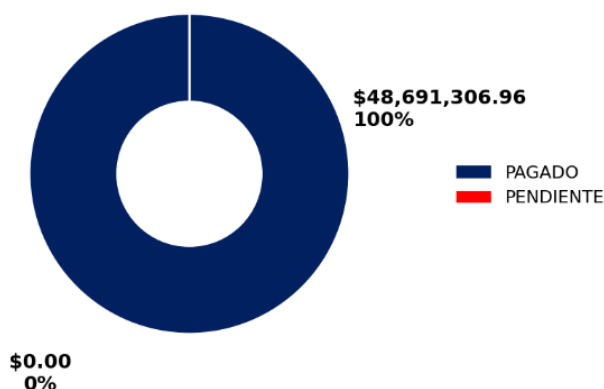

Avance del Proyecto

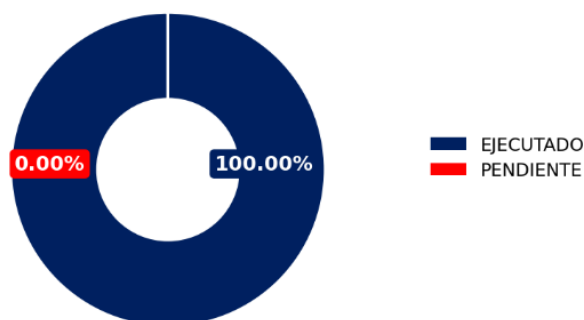

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamientos
- ✓ Importación de Equipos
- ✓ Transporte de Equipos
- ✓ Adecuación de Torre de Control
- ✓ Instalación de Sistema de Comunicación
- ✓ SAT

Estatus

CERRADO

**PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE PUNTA CANA (MDPC)**



PRESUPUESTO

RD\$276,159,479.72

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

100%



TOTAL PROYECTOS

2

AVANCE FÍSICO

100%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2019	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA	CERRADO
PRY-DINA-003-2022	NUEVO VOR/DME PNA	CERRADO

2.13. PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA

Código del Proyecto

PRY-DINA-003-2022

Líder del Proyecto

Oscar Alberto Ureña Núñez, Encargado
División de Radio Ayudas

Monto se Apropriación

RD\$119,500,000.00

Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Hitos del Proyecto

- ✓ Licitación
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Flight check
- ✓ Promulgación de la Publicación de la Facilidad

Estatus

CERRADO

Avance del Proyecto

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)



PRESUPUESTO

RD\$468,450,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



47.42%



TOTAL PROYECTOS

3

AVANCE FÍSICO



50.00%

CODIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	EN CIERRE
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	PAUSADO
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN

2.14. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA

Código

PRY-DINA-001-2022

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD\$249,000,000.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

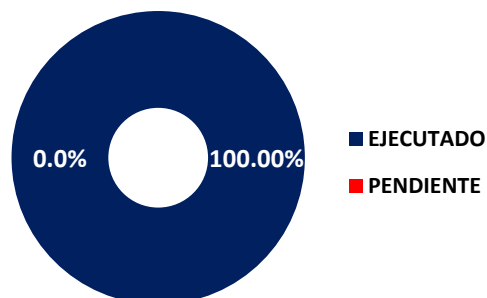

Ejecución Presupuestaria

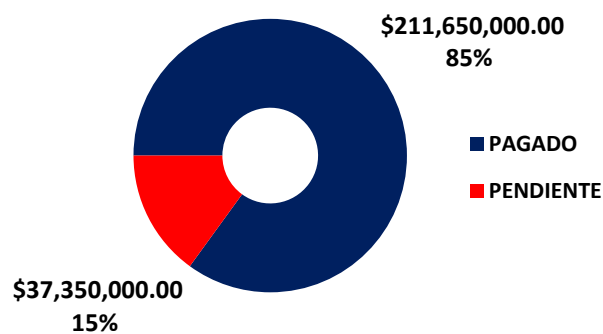

Hitos del Proyecto

- ✓ Entrenamientos
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Capacitación en Campo
- ✓ Sistemas de Vigilancia y Seguridad
- ✓ Climatización
- ✓ Energía Eléctrica

Estatus

EN CIERRE

2.15. PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

Código

PRY-DVSO-002-2023

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División
Comunicaciones de Radio


Monto de Apropriación

RD\$19,450,000.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

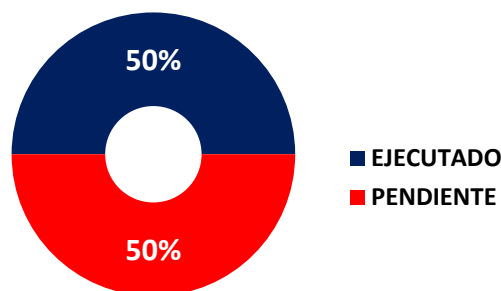

Ejecución Presupuestaria

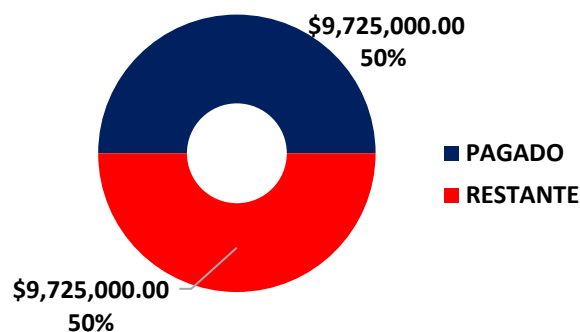

Hitos del Proyecto

- ✓ Aprobación Proyecto
- ✓ Firma Contrato
- ✓ FAT
- Instalación y Puesta en Marcha
- SAT
- Entrenamiento
- Cierre

Próximas Acciones

- Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL

Estatus

PAUSADO, pendiente radio enlace solicitado a INDOTEL.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)



PRESUPUESTO

RD\$359,242,740.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



TOTAL PROYECTOS

1

AVANCE FÍSICO



CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	PAUSADO

2.16. PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

Código

PRY-DINA-002-2021

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS


Monto de Apropriación

RD\$359,242,740.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

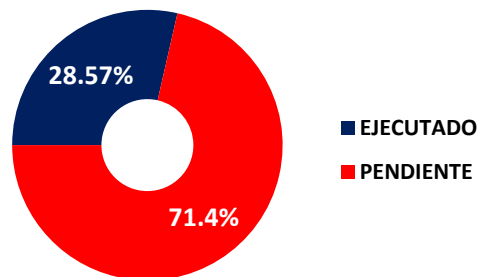

Ejecución Presupuestaria

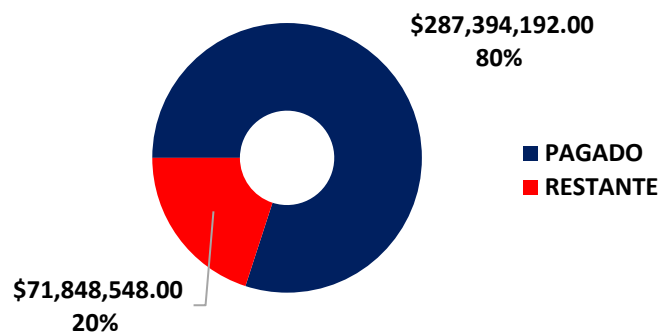

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- Recepción de Equipos
- Instalación
- SAT
- Flight Check
- Recepción Conforme de Bienes

Próximas Acciones

- Instalación, configuración y capacitación del personal.

Estatus

EJECUCIÓN

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)



PRESUPUESTO

RD\$171,973,836.31

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



TOTAL PROYECTOS

1

AVANCE FÍSICO



CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL "EL HIGÜERO"	PAUSADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA (MDLR)



PRESUPUESTO

RD\$186,100,000.00



TOTAL PROYECTOS

1

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSNA-002-2026	SISTEMA VOR/DME MDLR (LA ROMANA)	PLANIFICACIÓN

2.17. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO”

Código

PRY-DINA-001-2020

Líder de Proyecto


Elvis Collado, Encargado División
Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación


RD\$171,973,836.31

Contratista


GECI ESPAÑOLA, S.A.

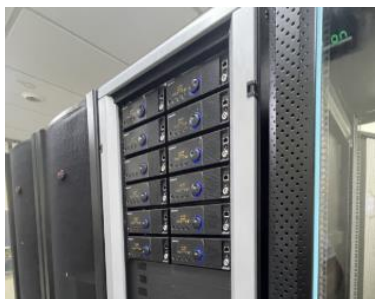

Avance del Proyecto

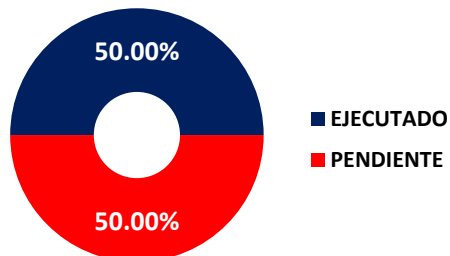

Ejecución Presupuestaria

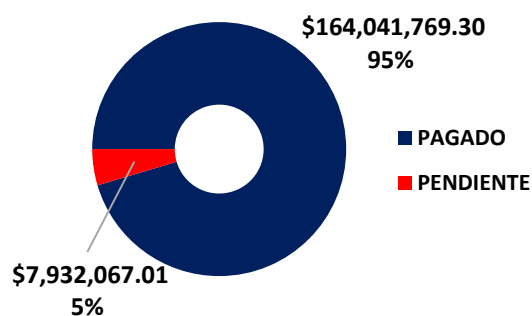

Hitos del Plan de Mejora

- ✓ Contratación
- ✓ FAT
- SAT
- Implementación y Puesta en Marcha

Próximas Acciones

- Concluir instalación

Estatus

PAUSADO, pendiente pago al contratista.

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO



PRESUPUESTO

RD\$1,039,500,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



0.00%

Proyectos en etapa de **Planificación**



TOTAL PROYECTOS

5

AVANCE FÍSICO



0.00%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA "AWOS" AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN

