SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

IDAC
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS

SEPTIEMBRE 2026

REALIZADO POR:

Carlos Dominguez
Coordinador de Proyectos

Instituto Dominicano de Aviación Civil
Departamento de Gestión de Proyectos
DGF
IDAC
Santo Domingo, R.D.

APROBADO POR:

Yildis Almonte
Directora de Planificación y Desarrollo

TABLA DE CONTENIDO

1. VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA 3
1. LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA 4
2. DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO 7
2.1. PROYECTO: AUTO CARBONO CERO 7
2.2. PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 8
2.3. PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO 9
2.4. PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA 10
2.5. PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM 11
2.6. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG 12
2.7. PLAN DE MEJORA: ATM- AMBIENTE DE SERVIDOR 13
2.8. PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO 15
2.9. PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL) 16
2.10. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO 17
2.11. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES 19
2.12. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP 20
2.13. PROYECTO: VOR/DME PUNTA CANA ..... Error! Bookmark not defined.
2.14. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA 22
2.15. PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS 23
2.16. PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO 25
2.17. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL “EL HIGUERO” 28


1. VISIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

PERÍODO: TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO) 2026


RESUMEN EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- **Total de Proyectos y Planes de Mejora:** 41
- **Presupuesto Total Aprobado:** RD$5,129,488,089.15
- **Monto Ejecutado a la Fecha:** RD$2,737,206,116.43
- **Avance Físico Promedio:** **62.17%**
- **Avance Financiero Promedio:** **53.36%**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

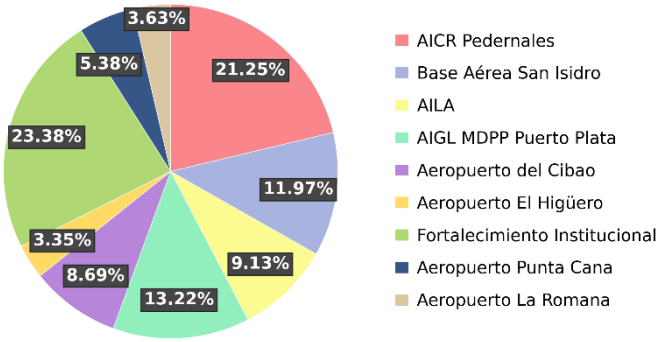

AVANCE FÍSICO GENERAL

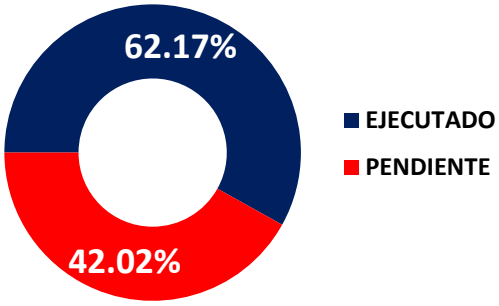

PROGRAMA	PRESUPUESTO
EQUPAMIENTO AICR PEDERNALES	RD$1,090,100,000.00
EQUIPAMIENTO BASE AÉREA SAN ISIDRO	RD$613,883,077.35
EQUIPAMIENTO AILA	RD$468,450,000.00
EQUIPAMIENTO AIGL MDPP PUERTO PLATA	RD$678,166,906.96
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INT. DEL CIBAO	RD$445,538,634.28
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO "EL HIGUERO"	RD$171,973,836.31
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	RD$1,199,116,154.53
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO PUNTA -CANA	RD$276,159,479.72
EQUIPAMIENTO AEROPUERTO LA ROMANA	RD$186,100,000.00

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

90% -100%	23
50% - 89%	4
<50%	0
=0%	14

1. LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES DE MEJORA

CÓDIGO	NOMBRE PROYECTO / PLAN DE MEJORA	ESTATUS
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	CERRADO
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	CERRADO
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	CERRADO
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	CERRADO
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	CERRADO
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	CERRADO
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	CERRADO
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	CERRADO
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	CERRADO
PRY-DINA-001-2021	AIM-SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	EJECUCIÓN
PRY-DTAC-001-2025	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSNA-001-2026	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSNA-002-2026	SISTEMA DVOR/DME MDLR (LA ROMANA)	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2026	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERONAVES NO TRIPULADAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2026	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA	PLANIFICACIÓN
PRY-DDS-001-2026	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN DEL RUIDO AERONÁUTICO	PLANIFICACIÓN
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”	PAUSADO
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	PAUSADO
PRY-DINA-001-2019	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO PUNTA CANA	CERRADO
PRY-DTIC-002-2021	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO	CERRADO
PRY-DTAC-001-2021	“IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS”	CERRADO
PRY-DA-001-2021	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES	CERRADO
PM-DNV-001-2020	INTEGRACIÓN DE LOS RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO	CERRADO
PRY-DCRP-001-2022	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)	CERRADO
PRY-DA-002-2022	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS	CERRADO
PRY-DFISC-001-2021	CERTIFICACIÓN ISO 37301	CERRADO
PRY-DTIC-001-2023	BASE DE DATOS INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CERRADO

PRY-DDS-001-2021	**AUTO CARBONO CERO**	**CERRADO**
PRY-DPD-001-2024	**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028**	**CERRADO**
PRY-DINA-003-2022	**NUEVO VOR-DME PNA**	**CERRADO**
PRY-DINA-005-2023	**RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)**	**CERRADO**



PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO

RD$1,194,125,603.3

TOTAL PROYECTOS

22

CODIGO	NOMBRE	ESTATUS
PM-DNV-001-2020	INTEGRACIÓN RPAS/DRONES AL SISTEMA AERONÁUTICO DOMINICANO	CERRADO
PRY-DFISC-001-2021	CERTIFICACIÓN ISO 37301	CERRADO
PRY-DA-001-2021	SISTEMA DE IMPRESIÓN EN TODAS LAS LOCALIDADES	CERRADO
PRY-DTIC-001-2021	PROYECTO COMPUTADORES – CAMBIO TOTAL	CERRADO
PRY-DTIC-002-2021	PROYECTO COMPUTADORES – POTENCIAMIENTO	CERRADO
PRY-DTAC-001-2021	IDAC MÁS CERCA DE LOS USUARIOS	CERRADO
PRY-DDS-001-2021	AUTO CARBONO CERO	CERRADO
PRY-DA-002-2022	COMPRA DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS	CERRADO
PRY-DCRP-001-2022	CABINA DE GRABACIÓN PARA VOCES EN OFF (DCRP)	CERRADO
PRY-DTIC-001-2023	BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	CERRADO
PRY-DPD-001-2024	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	CERRADO
PRY-DA-001-2022	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA	CERRADO
PM-DINA-002-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG	CERRADO
PM-DINA-001-2021	ATM - AMBIENTE DE SERVIDORES	EJECUCIÓN
PRY-DINA-001-2021	SOLUCIÓN MODULAR GESTIÓN AIM	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-004-2023	SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO	EJECUCIÓN
PRY-DTIC-001-2025	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PLANIFICACIÓN
PRY-DTAC-001-2025	TRANSFORMACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS	PLANIFICACIÓN
PRY-ASCA-001-2025	TRANSFORMACIÓN DIGITAL ECOSISTEMA EDUCATIVO ASCA IDAC	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-001-2026	SISTEMA NACIONAL GESTIÓN TRÁFICO AERNOAVES NO TRIPULADAS	PLANIFICACIÓN
PRY-DTIC-002-2026	SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DINA	PLANIFICACIÓN
PRY-DDS-001-2026	PROYECTO MONITOREO Y REDUCCIÓN RUIDO AERONÁUTICO	PLANIFICACIÓN

2. DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO
2.1. PROYECTO: AUTO CARBONO CERO

Código del Proyecto

PRY-DDS-001-2021

Líder del Proyecto

Geldy Núñez, Analista de Proyectos de Desarrollo Sustentable

Monto de Apropiación

RD$17,520,750.00


Contratista

PERAVIA MOTORS, S.A.






Avance del Proyecto

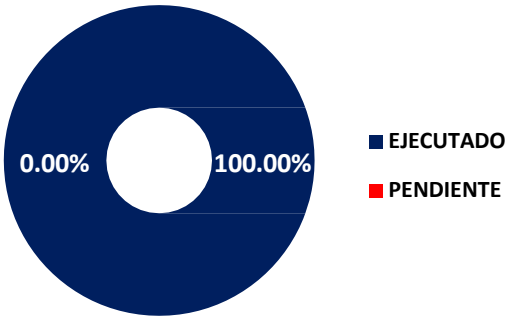

Ejecución Presupuestaria

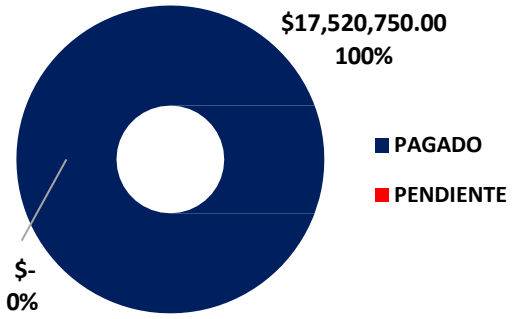

Hitos del Proyecto

- ✓ Conformación de Comisión para Pliego de Condiciones
- ✓ Pliego de Condiciones
- ✓ Licitación
- ✓ Adquisición de Vehículos
- ✓ Asignación de Vehículos

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

2.2. PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028

Código

PRY-DPD-001-2024

Líder del Proyecto

Charmery Graciano, Encargada
Departamento FME PPP

Monto de Apropiación


RD$1,550,000.00

Contratista


GRH CONSULTORES, S.R.L.



Avance del Proyecto

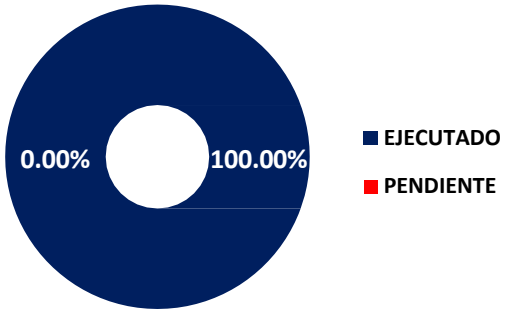

Ejecución Presupuestaria

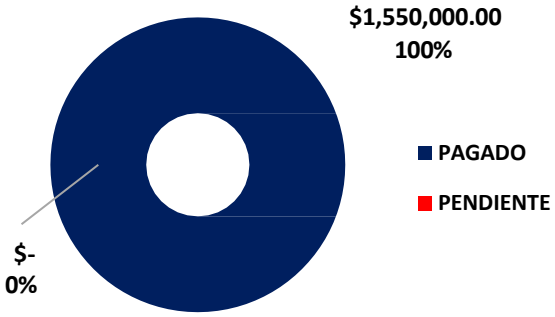

Hitos del Proyecto

- ✓ Preámbulo Objetivos
- ✓ Análisis Estratégico
- ✓ Borrador PEI
- ✓ Revisión
- ✓ Aprobación
- ✓ Presentación y publicación

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

2.3. PROYECTO: SEGURIDAD FÍSICA COMPLEJO NORGE BOTELLO

Código

PRY-DTIC-004-2023

Líder de Proyecto

Gerardo Guzmán, Encargado Seguridad y Monitoreo TIC

Monto de Apropiación

RD$77,624,232.40


Contratista

INPROTEC, S.R.L.






Avance del Proyecto

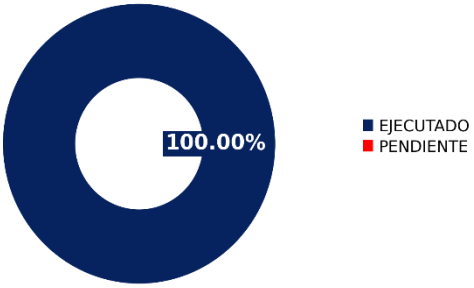

Ejecución Presupuestaria

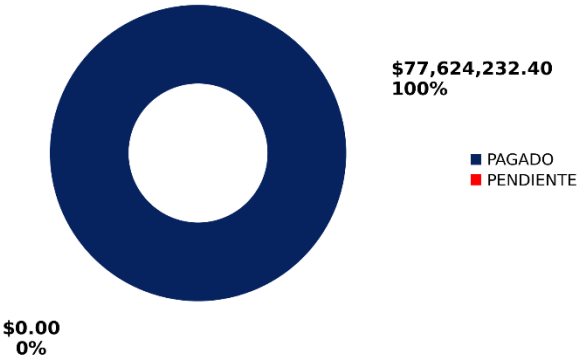

Hitos del Proyecto

- ✓ Levantar Proceso de Compra
- ✓ Asignación de Proveedor
- ✓ Implementación del Sistema de Seguridad Física NG
- ✓ Pruebas, Capacitación y Recepción del Sistema

Próximas Acciones

- N/A

Estatus

CERRADO

2.4. PROYECTO: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ASCA

Código

PRY-DA-001-2022

Líder de Proyecto

Felipe Diloné

Monto de Apropiación

RD$119,011,766.62


Contratista

ROMACA INDUSTRIAL, S.A.






Avance del Proyecto

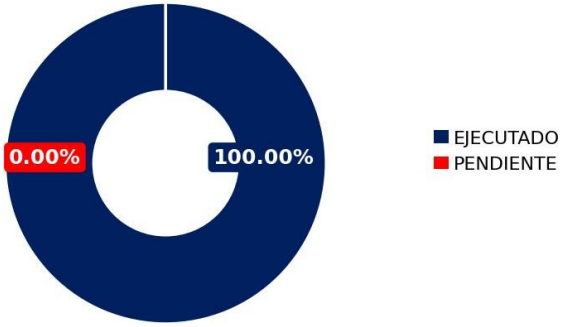

Ejecución Presupuestaria

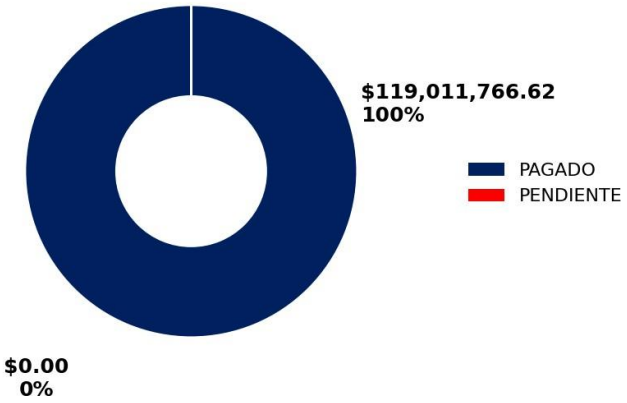

Hitos del Proyecto

- ✓ Adecuación del lugar
- ✓ Adquisición del sistema
- ✓ Entrenamiento del personal
- ✓ Puesta en funcionamiento

Estatus

CERRADO

2.5. PROYECTO: SOLUCIÓN MODULAR DE GESTIÓN AIM

Código

PRY-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Alexander Gabirondo, Encargado Sección de Estaciones de Servicio de Vuelo


Monto de Apropiación

RD$358,200,000.00


Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.


Diagrama de red Rack Norge Botello (19/12/24)

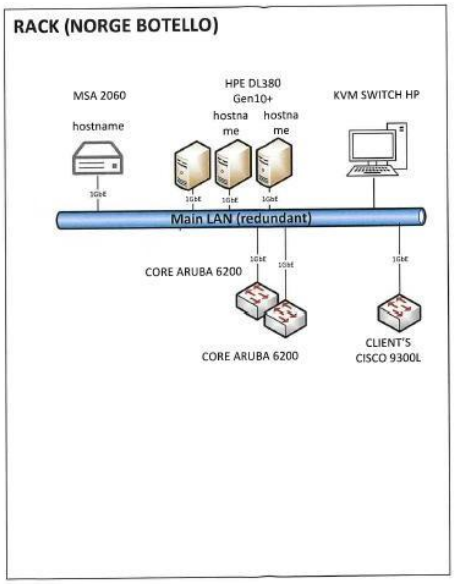

Avance del Proyecto

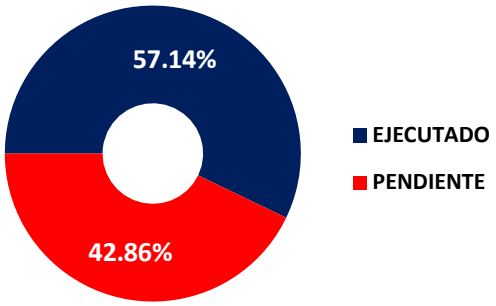

Ejecución Presupuestaria

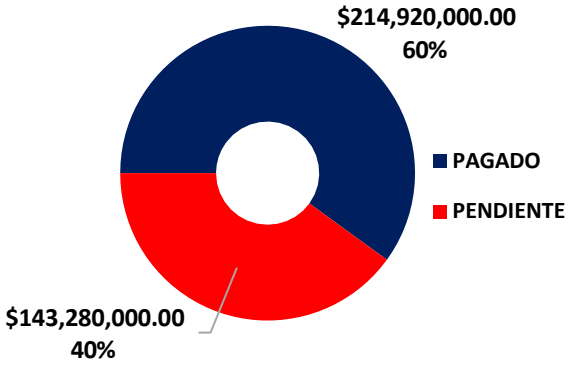

Hitos del Proyecto

- ✓ Diseño del Sistema
- ✓ Personalización del Sistema
- ✓ FAT
- o Instalación y Puesta en Marcha
- o SAT
- ✓ Entrenamientos en Fábrica
- o Entrenamientos En Sitio
- o Garantía

Próximas Acciones

- Puesta en marcha del sistema

Estatus

EJECUCIÓN

2.6. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES NG

Código

PM-DINA-002-2022

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$57,423,551.20


Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.






Avance del Proyecto

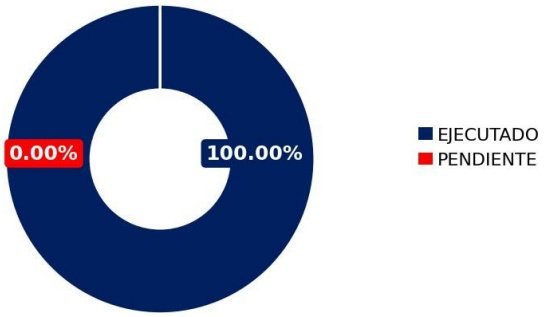

Ejecución Presupuestaria

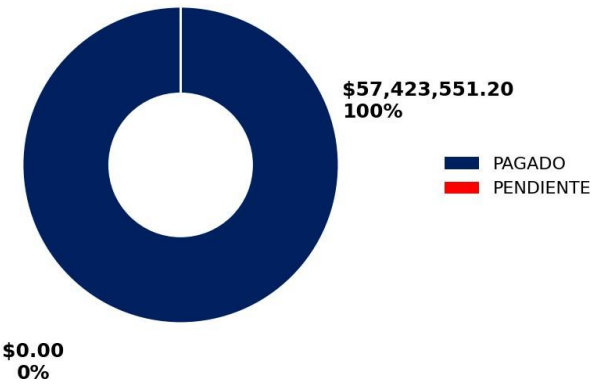

Hitos del Proyecto

- ✓ Licitación
- ✓ FAT
- ✓ Instalación Sistema de Comunicaciones
- ✓ SAT

Estatus

CERRADO

2.7. PLAN DE MEJORA: ATM- AMBIENTE DE SERVIDOR

Código

PM-DINA-001-2021

Líder de Proyecto

Jonathan Méndez, Encargado División Sistemas Radar


Monto de Apropiación

RD$41,888,689.56


Contratista

XBYTE, SRL.

Avance del Proyecto

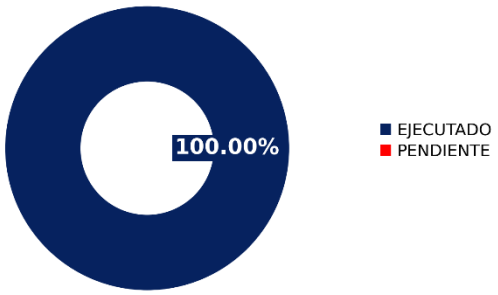

Ejecución Presupuestaria

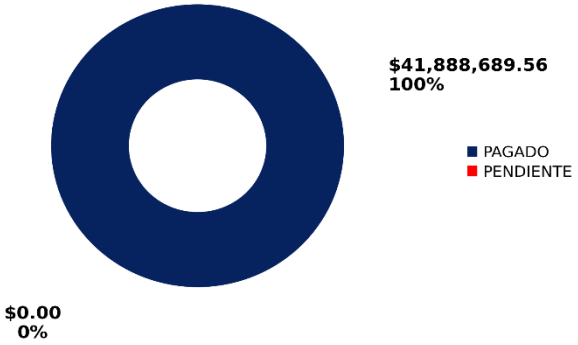

Hitos del Plan de Mejora

- ✓ Licitación
- ✓ Instalación y Puesta en Marcha
- ✓ Entrenamiento

Próximas Acciones

- N/A

Estatus

CERRADO



PROGRAMA EQUIPAMIENTO BASE AÉREA DE SAN ISIDRO (MDSI)

PRESUPUESTO

RD$613,883,077.35

TOTAL PROYECTOS

3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 100%

AVANCE FÍSICO 100%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSO-001-2023	VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO	CERRADO
PRY-DVSO-003-2023	TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)	CERRADO
PRY-DVSO-004-2023	SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO	CERRADO

2.8. PROYECTO: VOR AEROPUERTO SAN ISIDRO

Código del Proyecto

PRY-DVSO-001-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto se Apropiación

RD$119,417,734.46


Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.






Avance del Proyecto

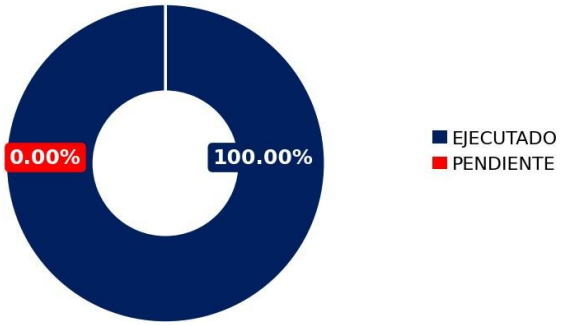

Ejecución Presupuestaria

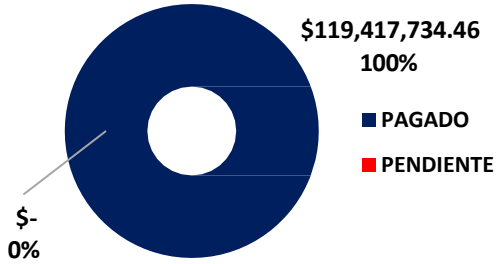

Hitos del Proyecto

- ✓ Recepción y Transporte de Equipos
- ✓ Obra Civil
- ✓ Entrenamientos en Fábrica
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Flight Check
- ✓ Aceptación Técnica Operativa

Estatus

CERRADO

2.9. PROYECTO: TORRE AEROPUERTO SAN ISIDRO (CABINA DE CONTROL)

Código

PRY-DVSO-003-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD$334,559,713.39

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

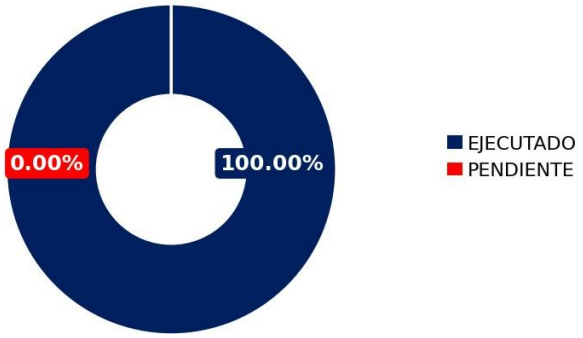

Ejecución Presupuestaria

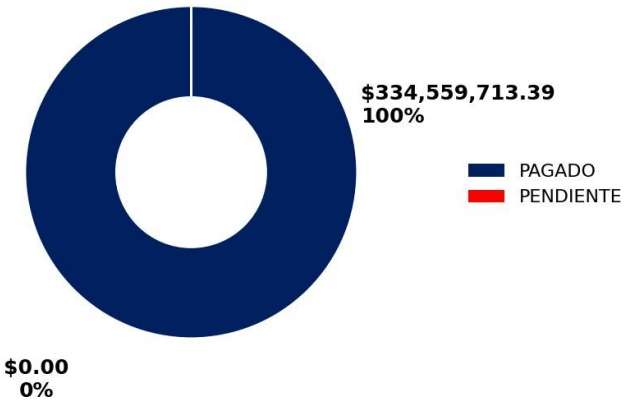

Hitos del Proyecto

- ✓ Obra Civil
- ✓ Cabina de Control
- ✓ Equipamiento
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- ✓ FAT
- ✓ Pruebas de Integración Sistemas
- ✓ SAT
- ✓ Informe Final de Instalación

Estatus

CERRADO

2.10. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SAN ISIDRO

Código

PRY-DVSO-004-2023

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$130,500,000.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.






Avance del Proyecto

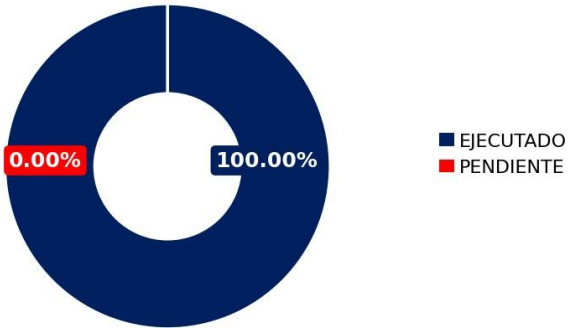

Ejecución Presupuestaria

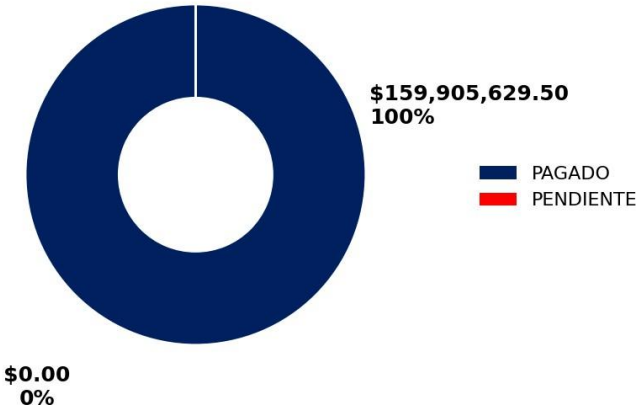

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- ✓ Importación de Equipos
- ✓ Transporte de Equipos
- ✓ Instalación de Equipos
- ✓ SAT

Estatus

CERRADO



PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL GREGORIO LUPERÓN (MDPP)

PRESUPUESTO

RD$678,166,906.96

TOTAL PROYECTOS

3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

43.97%

AVANCE FÍSICO

66.67%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-005-2023	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES (PUERTO PLATA)	CERRADO
PM-DINA-003-2022	UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP	CERRADO
PRY-DVSNA-001-2026	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO MDPP (PUERTO PLATA)	PLANIFICACIÓN

2.11. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO ISABEL DE TORRES

Código del Proyecto

PRY-DINA-005-2023

Líder del Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación

RD$249,475,600.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.






Avance del Proyecto

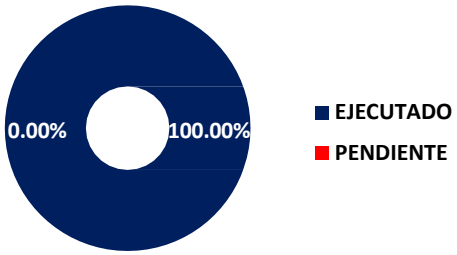

Ejecución de Presupuesto

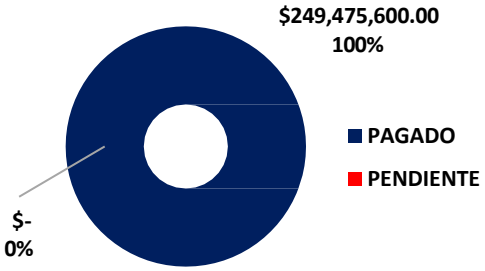

Hitos del Proyecto

- ✓ Adjudicación
- ✓ FAT
- ✓ Construcción del Emplazamiento
- ✓ SAT
- ✓ Inauguración del Sistema

Próximas Acciones

N/A

Estatus

CERRADO

2.12. PLAN DE MEJORA: UPGRADE SISTEMA DE COMUNICACIONES AIGL MDPP

Código

PM-DINA-003-2022

Líder de Proyecto

Elvis Antonio Collado

Monto de Apropiación

RD$48,691,306.96


Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.






Avance del Proyecto

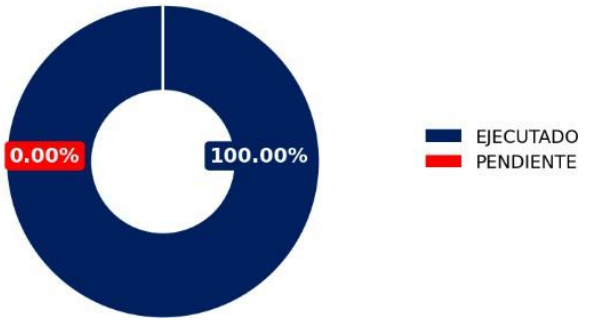

Ejecución Presupuestaria

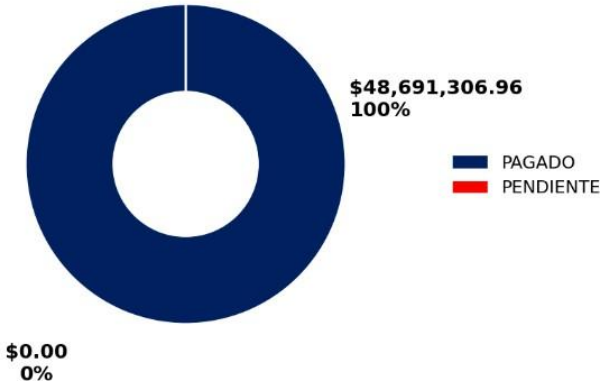

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamientos
- ✓ Importación de Equipos
- ✓ Transporte de Equipos
- ✓ Adecuación de Torre de Control
- ✓ Instalación de Sistema de Comunicación
- ✓ SAT

Estatus

CERRADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (MDSD)



PRESUPUESTO	TOTAL PROYECTOS
RD$468,450,000.00	3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	AVANCE FÍSICO
55.23%	50.00%

CODIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2022	RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA AILA	EN CIERRE
PRY-DVSO-002-2023	COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS	PAUSADO
PRY-DINA-001-2025	SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) LAS AMÉRICAS	PLANIFICACIÓN

2.13. PROYECTO: RADAR DOPPLER METEOROLÓGICO BANDA C PARA EL AILA

Código

PRY-DINA-001-2022

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS

Monto de Apropiación


RD$249,000,000.00

Contratista


AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.



Avance del Proyecto

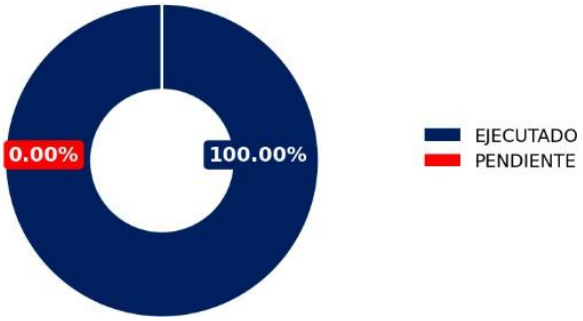

Ejecución Presupuestaria

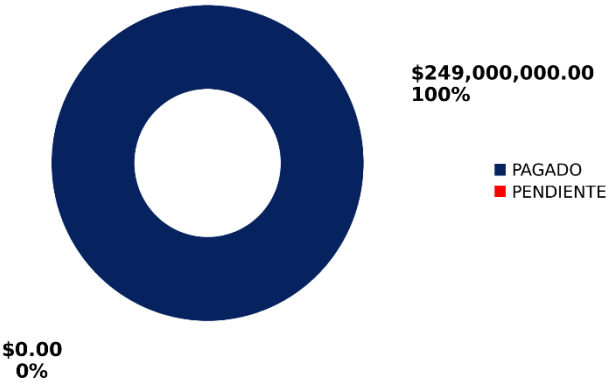

Hitos del Proyecto

- ✓ Entrenamientos
- ✓ FAT
- ✓ SAT
- ✓ Capacitación en Campo
- ✓ Sistemas de Vigilancia y Seguridad
- ✓ Climatización
- ✓ Energía Eléctrica

Estatus

CERRADO

2.14. PROYECTO: COMUNICACIONES POR MICRO-ONDAS

Código

PRY-DVSO-002-2023

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio


Monto de Apropiación

RD$19,450,000.00


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

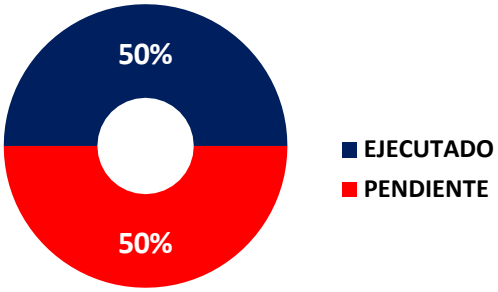

Ejecución Presupuestaria

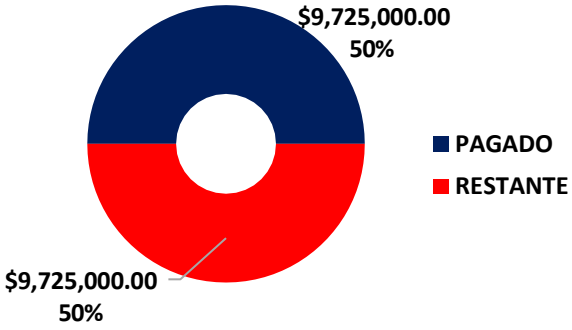

Hitos del Proyecto

- ✓ Aprobación Proyecto
- ✓ Firma Contrato
- ✓ FAT
- ○ Instalación y Puesta en Marcha
- ○ SAT
- ○ Entrenamiento
- ○ Cierre

Próximas Acciones

- Obtención de radio enlace solicitado a INDOTEL

Estatus

PAUSADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (MDST)



PRESUPUESTO

RD$445,538,634.28

TOTAL PROYECTOS

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

76.13%

AVANCE FÍSICO

28.57%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-002-2021	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO	EJECUCIÓN

2.15. PROYECTO: AMPLIACIÓN COBERTURA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL TMA CIBAO

Código

PRY-DINA-002-2021

Líder de Proyecto

Rafael Abreu, Inspector de la Seguridad Operacional CNS


Monto de Apropiación

RD$445,538,634.28


Contratista

AIRPORT TEAM SOLUTIONS, S.R.L.

Avance del Proyecto

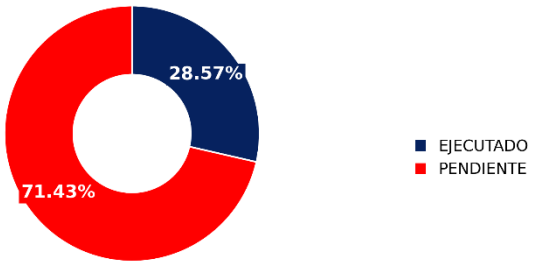

Ejecución Presupuestaria

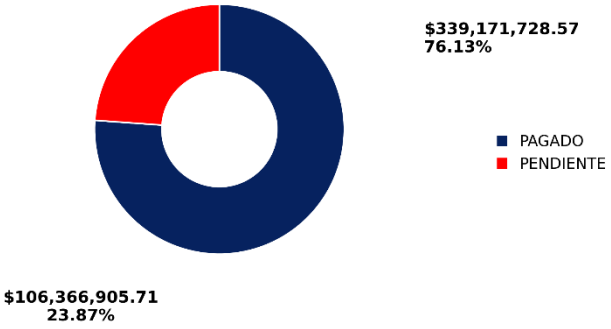

Hitos del Proyecto

- ✓ FAT
- ✓ Entrenamiento en Fábrica
- ○ Recepción de Equipos
- ○ Instalación
- ○ SAT
- ○ Flight Check
- ○ Recepción Conforme de Bienes

Próximas Acciones

- Instalación, configuración y capacitación del personal.

Estatus

EJECUCIÓN

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL JOAQUÍN BALAGUER (MDJB)



PRESUPUESTO

RD$171,973,836.31

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

95.39%

TOTAL PROYECTOS

1

AVANCE FÍSICO

50.00%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DINA-001-2020	SISTEMA DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL “EL HIGÜERO”	PAUSADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ROMANA (MDLR)



PRESUPUESTO

RD$186,100,000.00

TOTAL PROYECTOS

1

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSNA-002-2026	SISTEMA VOR/DME MDLR (LA ROMANA)	PLANIFICACIÓN

2.16. PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN TORRE DE CONTROL "EL HIGUERO"

Código

PRY-DINA-001-2020

Líder de Proyecto

Elvis Collado, Encargado División Comunicaciones de Radio

Monto de Apropiación

RD$171,973,836.31


Contratista

GECI ESPAÑOLA, S.A.






Avance del Proyecto

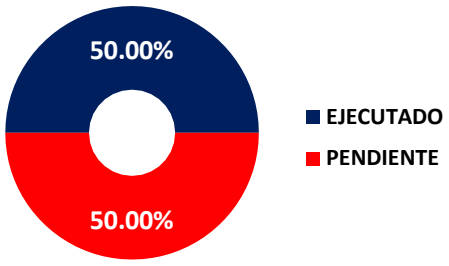

Ejecución Presupuestaria

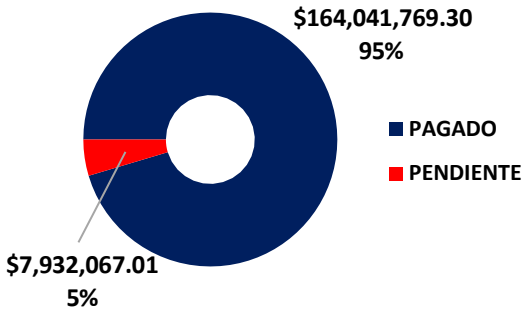

Hitos del Plan de Mejora

- ✓ Contratación
- ✓ FAT
- ○ SAT
- ○ Implementación y Puesta en Marcha

Próximas Acciones

- Concluir instalación

Estatus

PAUSADO

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO



PRESUPUESTO	TOTAL PROYECTOS
RD$1,090,100,000.00	5

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	AVANCE FÍSICO
13.13%	9.00%

CÓDIGO	NOMBRE	ESTATUS
PRY-DVSO-001-2025	CABINA DE AERÓDROMOS AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-002-2025	SISTEMA DE COMUNICACIONES AIRE/TIERRA/AIRE AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-003-2025	ESTACIÓN METEOROLÓGICA “AWOS” AICR	PLANIFICACIÓN
PRY-DVSO-004-2025	SISTEMA DVOR/DME AICR	EJECUCIÓN
PRY-DVSO-005-2025	RADAR PRIMARIO/SECUNDARIO AICR	PLANIFICACIÓN
